



लुम्बिनी प्रदेश सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
वन निर्देशनालय



भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय तानसेन, पाल्पा




संरक्षण पार्श्वचित्र

आ.व. २०८२/०८३

संरक्षण पार्श्व चित्र

२०८२/०८३



लुम्बिनी प्रदेश सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
वन निर्देशनालय

भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय
तानसेन, पाल्पा



प्रकाशन:

भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, पाल्पा

वन निर्देशनालय

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

लुम्बिनी प्रदेश

२०८३

Copyright©

भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, पाल्पा

वन निर्देशनालय

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

लुम्बिनी प्रदेश

All rights reserved, Published 2024

The Contributors :

रोवर्ट महारा

नि. वरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत

भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, पाल्पा

सन्दीप चौधरी

वरिष्ठ भू-संरक्षण अधिकृत

भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, पाल्पा

फोटो:

रोवर्ट महारा

सन्दीप चौधरी

बालकृष्ण कार्की

सुमित बस्नेत



लुम्बिनी प्रदेश सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
वन निर्देशनलय



भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय

तानसेन, पाल्पा

प्राक्कथन

जलाधार त्यो भौगोलिक क्षेत्र हो जहाँबाट सबै पानी एकै दिशा वा प्रणालीमा एकत्रित हुन्छ। प्रत्येक जलाधार आफैमा भौगोलिक, पारिस्थितीकीय, जलवायु, जलको गुणस्तर, भू-उपयोग तथा मानव संस्कृतिका हिसाबले अद्वितीय र बेग्लै महत्वको छ। जलस्रोत तथा भूमिको दिगो उपयोग सुनिश्चित गरी पारिस्थितीकीय प्रणालीको संरक्षण र व्यवस्थापनको लक्ष्य सहित जलाधारको व्यवस्थापन अति जरुरत पर्दछ। यदी व्यवस्थापन गरिएन भने भविष्यमा जलजन्य प्राकृतिक प्रकोपहरूको जोखिम बढ्नुका साथै पानीको अभाव भई जलसंकट देखा पर्ने जसको फलस्वरूप जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी समस्या र प्रकोप बढ्दै जाने निश्चित भएका कारण जलाधार क्षेत्रलाई इकाईको रूपमा लिई उपल्लो र तल्लो तटीयक्षेत्रलाई आपसमा जोडेर एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन। यसै सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण तथा अनुकूलन गर्नका लागि विभिन्न क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गर्दै जल, जलस्रोत तथा भूमिको संरक्षणबाट भूमिको उत्पादकत्व वृद्धि गरी जलाधार क्षेत्रहरूको एकिकृत संरक्षण र व्यवस्थापनमा सेवा प्रवाह गर्नका लागि पाल्पा जिल्लामा २०३३ सालमा नै तिनाउ जलाधार आयोजना स्थापना भएको थियो भने २०४० सालमा जिल्ला भू संरक्षण कार्यालयको स्थापना भयो। नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन र राज्य पुनर्संरचना पश्चात लुम्बिनी प्रदेशका पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, रुपन्देही र नवलपरासी (ब.सु.प.) कार्यक्षेत्र रहने गरी वि.सं. २०७५/०६/२२ मा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना भएको हो। सिमित जनशक्ति र श्रोत साधनले ६ जिल्लामा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कठिनाई भइरहेको सन्दर्भमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको निर्णयबाट २०७८ साल देखी यस कार्यालयको कार्यक्षेत्र गुल्मी, अर्घाखाँची र कपिलवस्तु जिल्ला कार्यक्षेत्र रहने गरी भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय अर्घाखाँची अस्थाई कार्यालयको रूपमा स्थापना भएकाले हाल यस कार्यालयबाट वार्षिक कार्यक्रमहरू बाँकी ३ जिल्लामा कार्यान्वयन हुने गर्दछ।

नेपालमा मुख्यतया भूक्षय, पहिरो तथा नदी कटान जस्ता कारणहरूले गर्दा भूस्खलन भई जलाधार क्षेत्रको क्षयीकरणको समस्या तथा परिणामहरू देखा परिरहेका छन्। वातावरणीय अध्ययन बेगर निर्माण गरिएका ग्रामीण सडकहरू समेत अहिले जटील समस्याका रूपमा देखा परेका छन्। सतही माटोको क्षयीकरणको कारणले माटोको उर्वरा शक्ति र उत्पादकता घट्दै गएको छ जसको असर प्रत्यक्ष रूपमा कृषि उत्पादनमा परिराखेको छ। दिनानुदिन जलाधार क्षेत्रहरू संवेदनशिल हुँदै जानुका मुख्य कारणहरू कमजोर भू-स्वरूप, अव्यवस्थित रूपमा निर्माण गरिएका ग्रामीण सडकहरू, संरक्षण अभ्यासहरू नगरी भूमि श्रोतको अविवेकी प्रयोग, वन र अन्य प्राकृतिक स्रोतहरूको विनाशका साथै बढ्दो जनसंख्याको प्राकृतिक स्रोतहरूमा हुने दबाव आदी छन्। यसै सन्दर्भमा यस कार्यालय लुम्बिनी प्रदेश सरकारको तर्फबाट पाल्पा, प्युठान र रुकुम पूर्व जिल्लाहरूमा भूसंरक्षण र जलाधार व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि एक जिम्मेवार सरकारी निकाय हो।

भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, पाल्पाले चालु आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा आफ्नो कार्यक्षेत्रका ९१ वटा योजनाहरू १०१ स्थानमा जलाधार व्यवस्थापनका क्रियाकलापहरू कार्यान्वयन गरेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेशबाट विनियोजन भएर आएका र संघ सशर्त अनुदान अन्तर्गत विनियोजन भएका स्थान विशेषका कार्यक्रमहरू र प्याकेजका कार्यक्रम सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावली तथा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन नियमावलीका साथै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन र मन्त्रालयको कार्यविधिलाई टेकेर कार्यान्वयन भएका छन्। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन क्रियाकलापमा सिमित विनियोजित बजेट हुँदाहुँदै संवेदनशिलता र आवश्यकताका आधारमा योजनाहरू छनौट गरी कार्यान्वयन भएका छन्। यस आ.व.मा कार्यालयको श्रोतसाधन र जनशक्तीको समुचित परिचालन गरी कार्यालयले कार्यान्वयन भएका क्रियाकलापहरूमा शतप्रतिशत भौतिक प्रगति र ७५.७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ। यस वर्ष ३ वटा योजनाको स्थान फरक भई संशोधन गर्नुपर्ने र ५ वटा अनुपयुक्त ठाउँमा विनियोजन भएका योजनाहरू कार्यान्वयन भएका छैनन्। यस पार्श्वचित्रमा हामीले कार्यान्वयन गरेका प्रत्येक क्रियाकलापका जि.पि.एस. निर्देशाङ्क तथा तस्बिरहरू सहित संक्षिप्त रूप समावेश छ जुन अध्ययन अनुसन्धान तथा अनुगमन/मूल्याङ्कन उद्देश्यका लागि सरोकारवालाहरूलाई उपयोगी सावित हुनेछ भन्ने अपेक्षा व्यक्त गर्दछ।

कार्यालयको वार्षिक कार्यक्रम सफल कार्यान्वयनमा तथा यस पार्श्वचित्रको प्रकाशनमा अमूल्य योगदानको लागि वरिष्ठ भू संरक्षण अधिकृत श्री सन्दीप चौधरी र अन्य सबै कर्मचारीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।

.....
(रोबर्ट महारा)
कार्यालय प्रमुख

संरक्षण पार्श्वचित्र २०८२/०८३

III

संक्षिप्त रूप

भू.ज.व्य.का.: भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय

व.भू.सं.अ. : वरिष्ठ भू-संरक्षण अधिकृत

भू.सं.अ. : भू-संरक्षण अधिकृत

घ.मि. : घन मिटर

व.मि. : वर्ग मिटर

कि.मि. : किलोमिटर

मि. : मिटर

हे. : हेक्टर

स्वा.वा. क.: स्वायत्त एण्ड वाटर कन्जरभेषण

बा. वि. : बालि विकास

सा. प्र. : सामान्य प्रशासन

प्र. : प्रशासन

इरि. : इरिगेसन

ब. सु. प. : बर्दघाट सुस्ता पश्चिम

रु. : रुपैयाँ

प्रा. लि. : प्राइभेट लिमिटेड

ई. : ईन्जिनियर

विषय सूची

खण्ड १: कार्यालयको स्वरूप र प्रकृति	१
१.१ कार्यालयको परिचय तथा पृष्ठभूमि	१
१.२ कार्यालयको सांगठनिक संरचना	२
१.३ कार्यालयको स्वीकृत कर्मचारी दरबन्दी र पदपूर्तिको विवरण	२
१.४ कार्यालयको कार्यक्षेत्र	३
१.५ कार्यालयको लक्ष्य, उद्देश्य र नीति	३
१.५.१ दिर्घकालिन सोच	३
१.५.२ लक्ष्य	३
१.५.३ उद्देश्य	३
१.५.४ कार्यनीति	४
१.६ कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा तथा कार्यक्रमहरु	५
१.६.१ जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रम	५
१.६.२ विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन	५
१.६.३ दिगो भू व्यवस्थापन	७
१.६.४ बिकासका पूर्वाधार संरक्षण कार्यक्रम	७
१.६.५ प्रचार प्रसार, पार्श्वचित्र प्रकाशन र योजना तर्जुमा	८
१.७ कार्य सञ्चालन प्रक्रिया	८
खण्ड २: वार्षिक कार्यक्रम, बजेट तथा प्रगति	१०
२.१ आ.व.२०८२/०८३ मा संचालित कार्यक्रम तथा प्रगति	१०
२.१.१ लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट विनियोजित बजेट, कार्यक्रम तथा प्रगति विवरण	१०
२.१.१.१ समग्र बजेट तथा कार्यक्रम- बजेट रु लाखमा	१०
२.१.१.२ भू-संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम	११
२.१.१.३ जलाधार संरक्षण तथा सिमसार व्यवस्थापन र वातावरण विभाग कार्यक्रम (संघ सशर्त अनुदान)	१३
खण्ड ३: संरक्षण पार्श्वचित्र	१४
३.१ पाल्पा जिल्लामा संचालित कार्यक्रमहरुको पार्श्वचित्र	१४
३.२ रुपन्देही जिल्लामा संचालित कार्यक्रमहरुको पार्श्वचित्र	४७
३.३ नवलपरासी (ब.सु.प.) जिल्लामा संचालित कार्यक्रमहरुको पार्श्वचित्र	७४
खण्ड ४: सम्पादित कार्यक्रम र मुख्य उपलब्धि	१०७
४.१ सम्पादित कार्यक्रम तथा क्रियाकलापको विवरण	१०७
४.२ सम्पादित क्रियाकलाप/योजनाको नक्शांकन	१०८
४.३ सम्पादित क्रियाकलाप/योजना अनुसार निर्माण गरिएका भौतिक एवं वानस्पतिक संरचनाको विवरण एवं हासिल गरिएका उपलब्धीको विवरण	१०९

खण्ड १: कार्यालयको स्वरूप र प्रकृति


१.१ कार्यालयको परिचय तथा पृष्ठभूमि

तराईको समतल फाँट देखि हिमालसम्म विविध भौगोलिक अवस्था भएको हाम्रो देश नेपाल भिरालो भू बनोट, कमलो तथा अस्थिर भौगर्भिक अवस्था, मनसून केन्द्रित भारी वर्षा, भूकम्पीय संवेदनशिलता जस्ता प्राकृतिक कारणले हुने भू-क्षयको दृष्टिकोणले अत्यन्त संवेदनशिल छ भने मानवजन्य क्रियाकलापहरू खास गरी अनुपयुक्त भू-उपयोग, वन जंगल लगायत प्राकृतिक श्रोतहरूको विनास, वातावरणीय पक्षलाई बेवास्ता गरी सञ्चालन गरिने विकास निर्माणका कार्यहरू एवं जनचेतनाको कमि र जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभाव जस्ता कारणहरूले विशेष गरी पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा भू क्षय, बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरू उत्पन्न हुने र तराईमा ग्रेग्रान थुप्रिन गई भूमिको उत्पादकत्वमा हास, खेतीयोग्य जमिन र विकासका पूर्वाधारको विनास, जनधनको क्षति र वातावरणीय हास हुने जस्ता समस्याहरूलाई बढावा दिई एकातिर आक्रान्त बनाई रहेको छ भने अर्कोतिर कृषिमा निर्भर रहेको हाम्रो देशको अधिकांश नेपाली जनताको सामाजिक-आर्थिक अवस्थाका साथै देशको अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ ।

यही विकराल स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै देशका महत्त्वपूर्ण जलाधार क्षेत्रहरूको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न र स्थानीय जनताहरूलाई भू-संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन सम्बन्धि सेवाहरू प्रदान गर्न वि.सं. २०३१ साल श्रावण २४ गते केन्द्रियस्तरमा वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत भू तथा जल संरक्षण विभाग (२०५४ सालमा नाम परिवर्तन भई भू तथा जलाधार संरक्षण विभाग नामाकरण गरिएको) र जिल्लास्तरमा जिल्ला भू-संरक्षण कार्यालयहरू स्थापना गरी भू-संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन सम्बन्धि विभिन्न सेवामूलक एवं राहतमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आईरहेको सन्दर्भमा नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम देश संघीय संरचनामा अगाडि बढे सँगै नेपाल सरकारको मिति २०७५/०३/३२ गतेको निर्णयानुसार आ.व. २०७४/०७५ सम्म ६१ जिल्लाहरूमा रहेका साविकका जिल्ला भू-संरक्षण कार्यालयहरू खारेज भई सात वटै प्रदेशमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत २/२ वटा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरू र संघीय स्तरमा ४ वटा बृहत् जलाधार व्यवस्थापन केन्द्रहरू र १ वटा संघीय जलाधार व्यवस्थापन श्रोत केन्द्र रहने गरी भएको नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम यस लुम्बिनी प्रदेशमा दाङ र पाल्पा जिल्लामा रहने गरी कायम भएका २ वटा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरू वि.सं. २०७५ सालमा स्थापना भई यस कार्यालयको कार्यक्षेत्र पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, रुपन्देही र नवलपरासी (ब.सु.प.) गरी ६ जिल्ला रहेको थियो । १२ वटा जिल्लाहरूमा २ वटा कार्यालयले मात्र सेवा प्रवाह गर्दै आइराखेको अवस्थामा सेवा प्रवाहलाई केही हदसम्म भए पनि चुस्त दुरुस्त बनाउन र नागरिकको घरदैलो सम्म पुऱ्याउनको लागि साथै जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण तथा अनुकूलन र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गर्दै जल, जलश्रोत तथा भूमिको संरक्षण एवं व्यवस्थापनबाट भूमिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, जलाधार क्षेत्रहरूको एकिकृत संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकार, लुम्बिनी प्रदेश (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७८/०८/१६ गतेको निर्णयानुसार साविकको वन, वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी अस्थायी कार्यालयको रूपमा रोल्पा र अर्घाखाँचीमा कार्यालय स्थापना भए पश्चात यस कार्यालयको कार्यक्षेत्र ३ जिल्ला पाल्पा, रुपन्देही र नवलपरासी(ब.सु.प.) रहेको छ भने कार्यालय पाल्पा जिल्लाको तानसेन न.पा., वडा नं. ७, काजिपौवामा अवस्थित छ ।

मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै विगतमा जिल्ला भू-संरक्षण कार्यालयहरूले सञ्चालन गर्ने गरेका भू-संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन सम्बन्धी एकीकृत जलाधार संरक्षण तथा व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू उपलब्ध श्रोत साधन एवं स्वीकृत कार्यक्रम तथा बजेटका आधारमा कार्यक्षेत्र स्थित जलाधार क्षेत्रहरूमा पर्ने प्राथमिकता प्राप्त एवं संवेदनशिल उपजलाधार क्षेत्रहरू र भू-क्षय, बाढी, पहिरो तथा नदी खोलाको कटानीले ग्रस्त क्षेत्रहरूमा स्थानीय समुदायहरूको कार्यमूलक सहभागितामा यस कार्यालयबाट कार्यान्वयन हुँदै आएका छन्।

१.२ कार्यालयको सांगठनिक संरचना

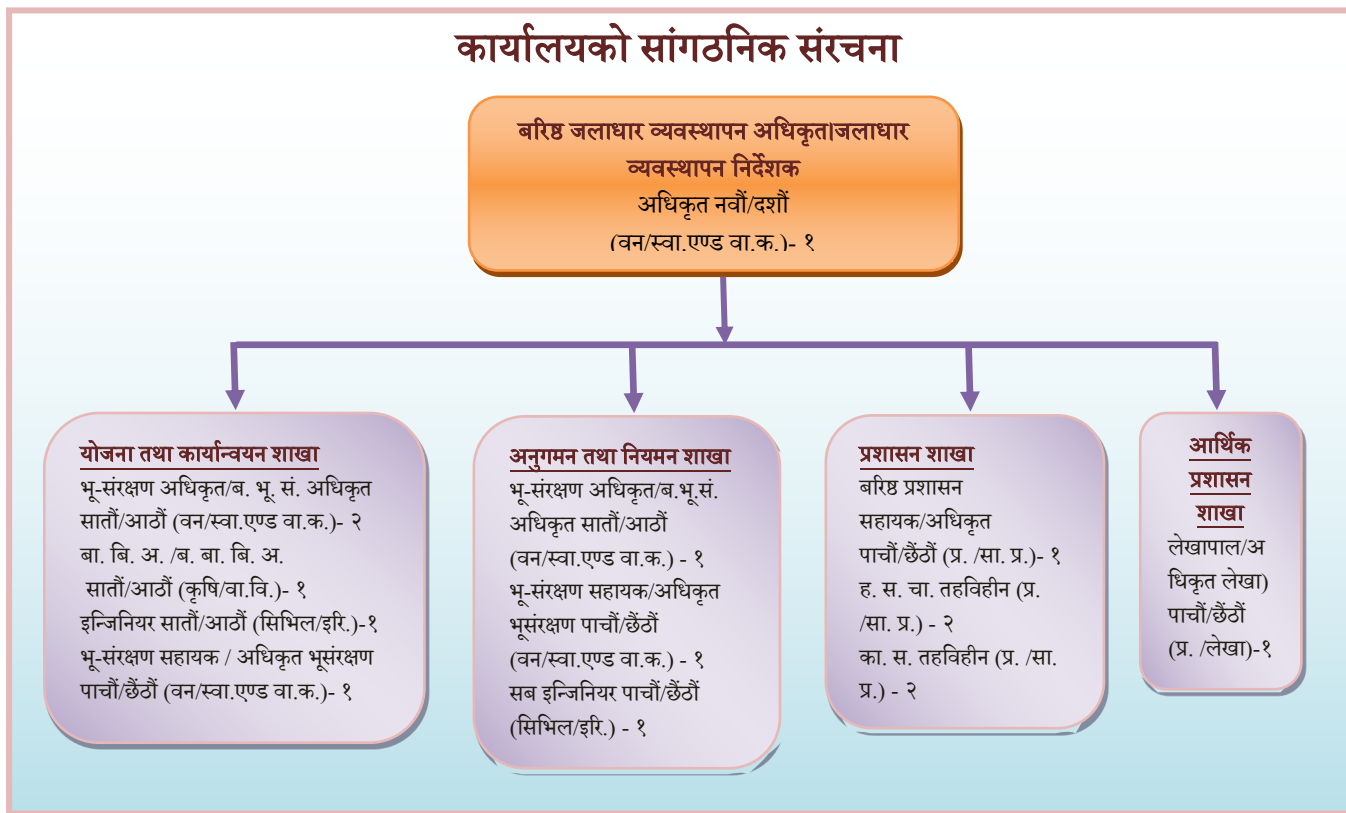


१.३ कार्यालयको स्वीकृत कर्मचारी दरबन्दी र पदपूर्तिको विवरण

क्र.सं.	पद	तह	सेवा/समूह	कूल दरबन्दी	पदपूर्ति	रिक्त	कैफियत
१	बरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत/जलाधार व्यवस्थापन निर्देशक	नवौं/दशौं	वन/स्वायल एण्ड वा. क.	१	०	१	
२	भू-संरक्षण अधिकृत/बरिष्ठ भू-संरक्षण अधिकृत	सातौं/आठौं	वन/स्वायल एण्ड वा. क.	३	२	१	
३	इन्जिनियर	सातौं/आठौं	इन्जिनियरिड/सिभिल/इरि.	१	१	०	करार
४	बाली विकास अधिकृत/बरिष्ठ बा. वि. अ.	सातौं/आठौं	कृषि/बालीविकास	१	०	१	
५	बरिष्ठ प्रशासन सहायक/ अधिकृत	पाचौं/छैटौं	प्रशासन/सामान्य प्रशासन	१	१	०	संघबाट काज
६	लेखापाल/अधिकृत (लेखा)	पाचौं/छैटौं	प्रशासन/लेखा	१	०	१	
७	भू संरक्षण सहायक/अधिकृत (भू संरक्षण)	पाचौं/छैटौं	वन/स्वायल एण्ड वा. क.	२	०	२	
८	सब-इन्जिनियर	पाचौं/छैटौं	इन्जिनियरिड/सिभिल/इरि.	२	१	१	करार
९	हलुका सवारी चालक	तहविहिन	प्रशासन/सामान्य प्रशासन	२	१	१	
१०	कार्यालय सहयोगी	तहविहिन	प्रशासन/सामान्य प्रशासन	३	२	१	करार
जम्मा				१७	८	९	

१.४ कार्यालयको कार्यक्षेत्र

यस कार्यालयले लुम्बिनी प्रदेशका ३ जिल्ला पाल्पा, रुपन्देही र नवलपरासी (ब.सु.प.) जिल्लाका ३३ स्थानीय तहमा एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनका विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दछ । जलाधारीय क्षेत्रको रुपमा विशेष गरी पूर्वखोला, निस्दी खोला, कञ्चन, माथिल्लो तिनाउ, घोडाहा, दानव, पहिला, तल्लो तिनाउ, भुलही, खजुरा खोला, तुरिया, कर्मैया खोला, झुरिया खोला, भुमही खोला उप-जलाधार क्षेत्रहरुमा कार्यालयबाट आवश्यक कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन हुन्छ ।

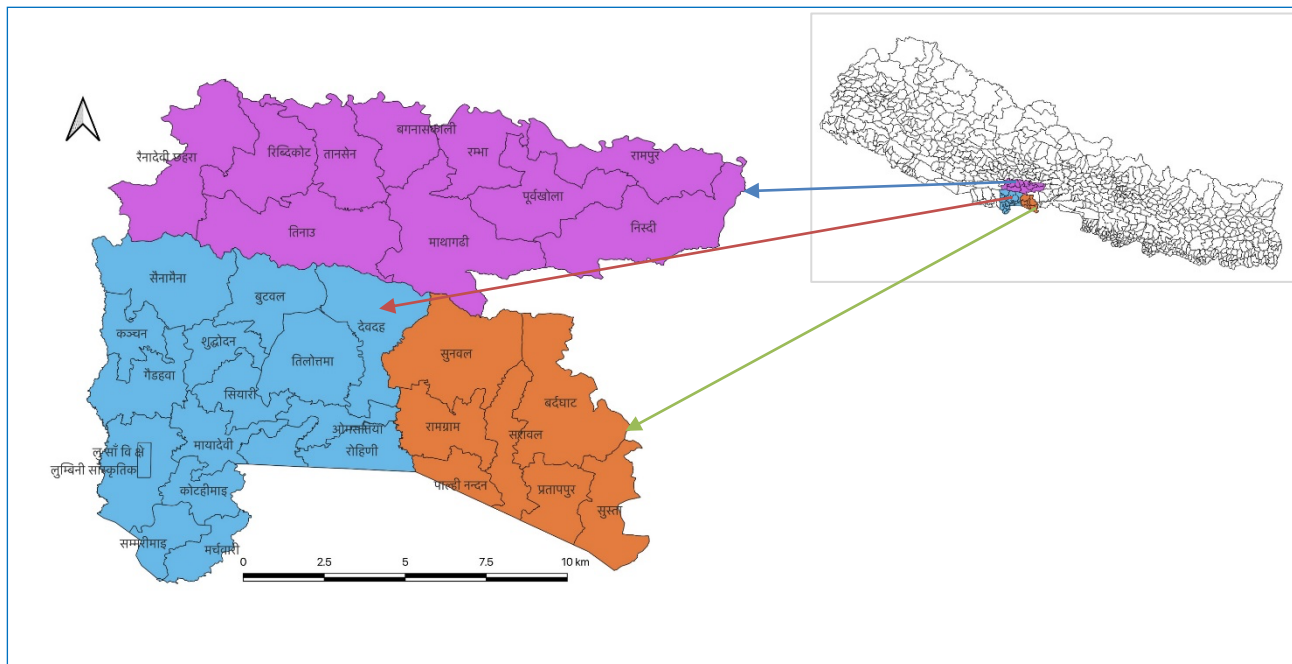

१.५ कार्यालयको लक्ष्य, उद्देश्य र नीति

१.५.१ दिर्घकालिन सोच

नदी प्रणालीमा आधारित जलाधारीय श्रोतहरुको एकीकृत र दिगो व्यवस्थापनबाट जलवायु समानुकूलन समृद्ध समाज निर्माणमा टेवा पुर्‍याउने ।

१.५.२ लक्ष्य

एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन द्वारा जलाधारीय श्रोतहरुको अन्तर सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्दै प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तन समानुकूलन र भूमि उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन मद्दत पुर्‍याउने ।

१.५.३ उद्देश्य

- कार्यक्षेत्र स्थित जलाधार क्षेत्रमा पर्ने महत्त्वपूर्ण उप-जलाधार क्षेत्रहरुको वर्गिकरण, प्राथमिकिकरण एवं संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गरी बाढी, पहिरो, भू-क्षय जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको चाप कम गदै पारस्थितिकीय (वातावरणीय) सन्तुलन कायम राख्न सहयोग पुर्‍याउने ।
- जलाधार, उपजलाधार क्षेत्रहरुको वैज्ञानिक व्यवस्थापनबाट भू-क्षय कम गरी जमिनको उर्वरा शक्ति कायम राख्नुका साथै विकासका पूर्वाधारहरुको संरक्षणमा सघाउ पुर्‍याई गरीबी निवारणमा टेवा पुर्‍याउने ।

- अध्ययन, अनुसन्धानद्वारा जलवायु परिवर्तनका कारणले परेका र पर्न सक्ने संभावित जोखिमको आँकलन गरी जलाधार/उप-जलाधार स्तरमा आवश्यक र उपयुक्त अनुकूलन/समानुकूलन प्रविधि एवं विपद् व्यवस्थापन कार्यक्रमको विकास र विस्तार गर्ने ।
- भू तथा जलाधार व्यवस्थापन सम्बन्धी विषय एवं कार्यक्रमहरुको बारेमा प्रचार प्रसार गरी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने ।
- सुशासन, समावेशी र सहभागितामुलक सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै सहज, सरल र पारदर्शी रुपमा एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनका सेवाहरु प्रवाह गर्ने ।

१.५.४ कार्यनीति

- विभिन्न स्तरका जलाधार (बृहत्, उप, सुक्ष्म) अनुरूप जलाधार क्षेत्रहरुको पहिचान, वर्गिकरण र प्राथमिकिकरण गरी जलाधार व्यवस्थापन योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने ।
- कार्यक्षेत्र स्थित जलाधार क्षेत्रमा पर्ने उप-जलाधार क्षेत्रलाई कार्य-सञ्चालन एवं नतिजा-प्रकाशनका लागी इकाईका रुपमा अपनाउने ।
- जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि, स्थानीय बासिन्दा र अन्तर-सम्बन्धित निकायहरु संगको समन्वय र सहकार्यमा समस्याको पहिचान देखि समाधान सम्मका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरुमा जनसहभागिता जुटाई एकीकृत रुपमा सेवा प्रदान गर्ने ।
- जलाधार क्षेत्रमा रहेका जमिनहरुको भू-क्षमताका आधारमा उपयोग गर्ने, भू-क्षय जोखिमयुक्त जमिनको पहिचान गरी संरक्षणका उपायहरु अवलम्बन गर्ने ।
- संरक्षणका सम्पूर्ण कार्य र प्रयासहरु "उपल्लो भेगको संरक्षण तल्लो भेगको फाइदा" भन्ने वैज्ञानिक मान्यताका साथ जिल्लाको उपल्लो जलाधार क्षेत्र र तल्लो जलाधार क्षेत्रमा कार्यक्रमहरु एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्ने ।
- संरक्षण कार्यलाई उत्पादनशिल, आयमुलक एवं बजाररमुखी ढाँचामा सञ्चालन गर्ने ।
- सही भू-उपयोग र संरक्षणमुलक वानस्पतिक संरचनात्मक (Bio-engineering) उपायहरु अपनाउने तर्फ विशेष जोड दिने ।
- संचालित कार्यक्रम दिगो बनाउन पूर्ण-उपचार (Complete Treatment) को आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
- जलाधार व्यवस्थापनका विविध पक्षहरु बारे प्रचार, प्रसार र समन्वय गर्ने ।
- संरक्षणका प्रयास बिना गरिने विकास निर्माणका कार्यलाई निरुत्साहित गरी वातावरणमैत्री दिगो विकास कार्यका लागी सबै क्षेत्रमा जोडदार पहल गर्ने ।
- एक वडा एक पोखरी अभियान मार्फत जमिनमा जल पुनर्भरण गरी जल संचिति बढाई भूमिको उत्पादकत्व वृद्धिमा सहयोग पुऱ्याउने ।

१.६ कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा तथा कार्यक्रमहरू

यस कार्यालयबाट देहाय बमोजिमका सेवा तथा कार्यक्रमहरू प्रदान गरिन्छ ।

१.६.१ जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रम

उद्देश्य

जलवायु परिवर्तनबाट श्रृजित नकारात्मक प्रभाव र असरलाई न्यूनीकरण एवं व्यवस्थापन गरी मानव जिवनलाई जलवायु अनुकूलित बनाउनुका साथै विकास निर्माणका कार्यलाई दिगो बनाउनु यसको मूल उद्देश्य हो ।

सञ्चालन गर्न सकिने कार्यक्रमहरू

पानी मुहान संरक्षण र विकास, जलाधार पुर्नस्थापना, संरक्षण पोखरी निर्माण, नदी तटीय खेती, सिमसार संरक्षण, वर्षामा आधारित खेतीपाती, भलपानी संकलन पोखरी निर्माण (Run-off Harvesting Dam Construction) ।

यस अन्तर्गत कार्यालयबाट निम्न क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न सकिने छन् ।

- परम्परागत पोखरीहरूको संरक्षण, पुरिएका पोखरी उत्खनन, गाउँघरको बाटोमा बग्ने भललाई पोखरी बनाई संकलन आदि ।
- पोखरी निर्माण, मर्मत सुधारको लागि सम्भावित स्थान पहिचान गर्न स्थानीय तह र उपभोक्ता समूहसँग समन्वय गरी स्थान छनौट ।
- स्थान छनौट गर्दा सार्वजनिक ऐलानी, पर्ति क्षेत्र, परम्परागत साना पोखरी भएका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई त्यस्तो स्थान नभएमा सामुदायिक वन, राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा रुख बिरुवाहरू नभएको तथा समुदायले सिंचाई गर्ने तथा Recharge प्रयोजनको लागि निजी जग्गामा समेत सिंचाई पोखरी निर्माण ।
- परम्परागत कुवा, ढुङ्गे धारा र पानीका श्रोतहरूको संरक्षण ।
- पानी श्रोतको सुक्ष्म जलाधार क्षेत्रमा तारबार गरी वृक्षारोपण ।
- मौजुदा ताल, पोखरी, सिमसार क्षेत्र संरक्षण र Runoff harvesting dam को निर्माण ।
- पानी श्रोत, सिमसार र संरक्षण पोखरीको तल माथि पहिरो, गल्छी तथा नदी कटान प्रभावित क्षेत्र भएमा सो नियन्त्रण गर्न चेकड्याम, टेवा पर्खाल तथा तटबन्ध लगायतका बायो-इन्जिनियरिङ कार्य ।
- नदी उकास जग्गामा खेतीपाति र वर्षामा आधारित खेतीपाति कार्य ।
- नियमित अनुगमन, होर्डिङ बोर्ड व्यवस्थापन, अध्ययन अवलोकन ।

अपेक्षित उपलब्धि

भू-संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यबाट पानीको उत्पादकत्व र गुणस्तर अभिवृद्धि, वातावरणीय स्वच्छता अभिवृद्धिका साथै स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा उल्लेख्य सुधार हुने ।

१.६.२ विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन

उद्देश्य

जलजन्य विपद् एवं प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षतिको कारण तल्लो तटीय र वरिपरिका क्षेत्रमा श्रृजित नकारात्मक असर र जोखिमहरूको न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गरी स्थानीय समुदायको जनजीवनलाई सहज बनाउने ।

सञ्चालन गर्न सकिने कार्यक्रमहरू

कार्यालयले यस अन्तर्गत पहिरो उपचार, गल्छी/खोल्सा खोल्सी उपचार, खहरे नियन्त्रण, खोलाकिनार संरक्षण कार्यका लागि कम खर्चिलो एवं बायो-इन्जिनियरिङ प्रविधिलाई अवलम्बन गरी स्थानीय उपभोक्ताको सहभागीता र सहकार्य लाई प्राथमिकता दिई सञ्चालन गर्दछ। तटबन्ध, स्पर र चेकड्याम जस्ता संरचना निर्माण गर्नु पर्ने भएमा नदीको लागि आवश्यक ठाउँ छोडेर नदी र खोलाको अर्को किनारामा कटान नबढ्ने गरी मात्र निर्माण गरिन्छ र तटबन्धको संरचना निर्माण गर्दा प्राविधिक रूपमा आवश्यक पर्ने लन्चिङ्ग एग्रेसन, डाइक र स्परहरूको व्यवस्था गरिन्छ साथै क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन अवधारणा अनुरूप प्याकेजमा गरिन्छ। क्रियाकलाप कार्यान्वयन गर्दा सर्भे, डिजाइन तथा ल.ई. यसमा स्थलगत नक्सा (लोकेशन म्याप), प्रभावित क्षेत्रको भू-उपयोग देखीने खेप्ता नक्सा, विभिन्न भागको लम्बाइ, चौडाइ, गहिराई, माटो तथा भू बनौट, प्रकोपको प्रकृति (Mud flow, debris flow, gully erosion size etc) तथा प्रभावित हुने घर परिवार संरचना वा सुरक्षित हुने जग्गा जमीनको क्षेत्रफल जस्ता विषयहरू समावेश गरिन्छ। कार्यालयमा उपलब्ध श्रोत, साधन र जनशक्तिको आधारमा निम्न लिखित क्रियाकलापहरू कार्यालयले संचालन गर्ने गर्दछ।

- नदी तथा खोलाको बहावलाई नियमन गरी किनारमा हुने अनियन्त्रित कटान र Overflow बाट बस्ती, खेतीयोग्य जमिन, नदी उकास जग्गाशकभन्ध र महत्वपूर्ण संरचना संरक्षण।
- नदी किनारा व्यवस्थापनका लागि नदी किनारामा संरचनाको निर्माण गर्दा नदी बहावको लागि प्राविधिक रूपले आवश्यक पर्ने नदीको बहाव क्षेत्र नघटाई गर्ने।
- निर्मित संरचनाको दिगो संरक्षण गर्नको लागि नदीको दुवै किनारामा स्पर, डाइक तटबन्धन बायो-इन्जिनियरिङ हरितपेटीका लगायतका संरक्षणका क्रियाकलापहरू गर्ने।
- आकस्मिक रूपमा पहिरो जाने क्षेत्रहरूको पहिचान गरी सूचीकरण अभिलेखीकरण गर्ने।
- आकस्मिक रूपमा पहिरो जाने क्षेत्रको अवस्था र हुन सक्ने संभावित क्षतिको बारेमा सम्बन्धित निकायहरुबाट सूचना संकलन गरी प्रोफाइल तयार गर्ने।
- आकस्मिक रूपमा पहिरो र नदी कटान भई गाउँबस्ती र राष्ट्रिय महत्वका संरचनामा जोखिम हुने अवस्था आएमा तत्काल कार्यक्रम सहयोग र रोकथामको लागि चेकड्याम, स्पर, डाइक, टेवा पर्खाल आदि संरचनाहरू निर्माण गर्ने र निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउने।
- कार्यालयबाट लागत अनुमान तयार गरि सम्बन्धित उपभोक्ता समूह उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी मार्फत संरक्षण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि संरचना तयार गर्ने।
- भलको व्यवस्थापन तथा पानीको निकास।
- कम खर्चिलो भू-संरक्षण प्रविधिको प्रयोग।
- Dry stone, loose stone, brush wood-check dam, fascine, palisade, wattling, brush layering, rip rap, hedge row, Contour trenching, contour bunding, jute netting आदीको प्रयोग।
- स-साना ग्यावियन चेकड्याम लगायतका इन्जिनियरिङ संरचना।
- बायो- इन्जिनियरिङ संरचना जस्तै घाँसरोपण, बाँसरोपण, वृक्षारोपण, हाँगा रोपण आदि।

अपेक्षित उपलब्धि

यस कार्यबाट जलजन्य विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन भई भूमि संरक्षण तथा भूमि उत्पादकत्व अभिवृद्धि, धनजनको क्षति न्यूनीकरण हुनुका साथै समुदायको जीविकोपार्जनमा सुधार हुने।

१.६.३ दिगो भू व्यवस्थापन

उद्देश्य

जमीनको क्षमता अनुसार उपयुक्त भू-उपयोग व्यवस्थापन कार्यबाट प्राकृतिक प्रक्रियाको पुर्नस्थापना गर्दै जमीनको उत्पादकत्व संरक्षण एवं अभिवृद्धि, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, आयमूलक कार्य तथा खाद्य आपूर्तिमा टेवा पुर्‍याई समुदायका मानिसको जीविकोपार्जनलाई सहज बनाउनु ।

सञ्चालन गर्न सकिने कार्यक्रमहरु

क्षतिग्रस्त भूमि पुनरोत्थान, भल तर्काउने नाला निर्माण, फलफूल रोपण, डालेघाँस/भुईँघाँस रोपण, नर्सरी/बिरुवा उत्पादन, दिगो माटो व्यवस्थापन, संरक्षण वृक्षारोपण, चरण व्यवस्थापन, भू-संरक्षणको दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण डालेघाँस, भुईँघाँस तथा अन्य फलफूल तथा बायो-इन्जिनियरिङ प्रजातिका बिरुवाहरु उत्पादन गरी वृक्षारोपण गर्न अभिप्रेरणा जगाई भू-संरक्षण तथा भू-उर्वरा शक्तिलाई कायमै राख्न यो क्रियाकलाप सञ्चालन गरिन्छ । बिरुवा वितरण गर्दा भू-क्षय भएका तथा हुन सक्ने स्थानमा रोपण गर्न जनसहभागिता परिचालन गरी गरिन्छ । कार्यालयमा उपलब्ध श्रोत, साधन र जनशक्तिको आधारमा निम्न लिखित क्रियाकलापहरु कार्यालयले संचालन गर्ने गर्दछ ।

- नर्सरीको मर्मत सुधार, विभिन्न प्रजातिका बीउ संकलन र खरीद, बिरुवा उत्पादन, बिरुवा वितरण, बिरुवा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन ।
- बिरुवा उत्पादनका लागि आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण ।
- क्षतिग्रस्त भूमि पुनरोत्थान (भल तर्काउने कुलो नाला, चेकड्याम, पर्खाल, हरियाली प्रवर्द्धनका कार्य आदि) क्रियाकलाप ।
- सिल्टेसन व्यवस्थापन ।
- हरियाली प्रवर्द्धनका साथै आय आर्जनका लागि फलफूलका बिरुवा उत्पादन, खरीद तथा वितरण कार्य ।

अपेक्षित उपलब्धि

गुणात्मक एवं परिमाणात्मक विभिन्न प्रजातिका बिरुवा उत्पादन भई क्षतिग्रस्त जग्गाको पुर्नस्थापना, हरियाली प्रवर्द्धन, रोजगारी श्रृजना, स्थानीय समुदायको आयआर्जनमा वृद्धि भई जनताको जीविकोपार्जनमा दिगो टेवा पुग्ने ।

१.६.४ बिकासका पूर्वाधार संरक्षण कार्यक्रम

उद्देश्य

जनताको आर्थिक अवस्था सुधारका लागि आधारभूत बिकासका पूर्वाधारहरुको संरक्षण गर्नु ।

सञ्चालन गर्न सकिने कार्यक्रमहरु

सिंचाई कूलो संरक्षण, सडक पाखो संरक्षण, संरक्षण पेटी विकास (Shelterbelt Development) , अवरोध पेटी विकास (Buffer Strip Development), गोरेटो सुधार ।

यो कार्यक्रम बिकासका पूर्वाधारहरुलाई जल उत्पन्न प्रकोपबाट बचाउन सञ्चालन गरिन्छ । विभिन्न निकायहरुबाट निर्माण भएका बिकासका पूर्वाधारहरुका संरक्षणका लागि उक्त संरचनाहरुलाई बाढी पहिरो जस्ता प्रकोपबाट बचाउने गरि क्रियाकलापहरु सञ्चालन गरिन्छ ।

यस कार्यक्रममा तपसिलका उपचार विधि प्रयोग गरिन्छ ।

- भलको व्यवस्थापन तथा पानीको वनकास ।
- कम खर्चिलो भू-संरक्षण प्रविधि ।

- Dry stone, loose stone, brush wood-check dam.
- Fascine, palisade, wattling, layering, rip rap, hedge row.
- Contour trenching, contour bunding, jute netting.
- स-साना ग्यावबयन चेकड्याम लगायतका इन्जिनियरीङ्ग संरचना ।
- बायो-इन्जिनियरीङ्ग संरचना जस्तै घाँस रोपण, बाँस रोपण, हाँगा रोपण आदि ।

अपेक्षित उपलब्धि

बिकासका पूर्वाधारहरुको संरक्षण भई दिगो सेवा प्रवाह हुने, पानीको व्यवस्थापन भई भूमिको उर्वराशक्ति वृद्धिबाट आयआर्जनमा टेवा पुगुका साथै हरियाली प्रवर्द्धन मार्फत् वातावरणीय स्वच्छता कायम हुने ।

१.६.५ प्रचार प्रसार, पार्श्वचित्र प्रकाशन र योजना तर्जुमा

उद्देश्य

जलाधार संरक्षण सम्बन्ध प्रचार प्रचार सामग्रीहरु प्रकाशन/खरीद गर्ने र सरोकारवालाहरु माझ भू-संरक्षण, वातावरणीय संरक्षण, वन संरक्षण, जलाधार व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन जस्ता विषयमा सचेतना अभिवृद्धि गर्दै संरक्षण अभियानमा सरोकारवालाहरुलाई बढी उत्तरदायी बनाउने ।

सञ्चालन गर्न सकिने कार्यक्रमहरु

- विभिन्न संरक्षण तथा शैक्षिक सामग्री तयारी, उत्पादन तथा प्रकाशन ।
- संरक्षण तथा शैक्षिक सामग्री खरीद तथा वितरण ।
- विभिन्न माध्यमबाट संरक्षण सन्देश प्रसारण ।
- वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयारी एवं प्रकाशन ।
- कार्यक्रम प्रभावकारिता अध्ययन तथा कार्यमूलक अनुसन्धान प्रतिवेदन ।
- क्रियाकलाप पार्श्वचित्र (Activity Profile) तयारी ।
- तालिम, गोष्ठी, अध्ययन, अवलोकन भ्रमण ।
- अनुगमन ।
- संरक्षण दिवस समारोह ।
- उपजलाधार प्राथमिकिकरण, योजना तर्जुमा ।

अपेक्षित उपलब्धि

सरोकारवालाहरु माझ भू-संरक्षण, जलाधार व्यवस्थापन वन/वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा सम्पादित कार्य प्रति सर्वसाधारण सुसुचित भई एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन कार्यको प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुने ।

१.७ कार्य सञ्चालन प्रक्रिया

विशेषतः भू-संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यक्षेत्र अन्तर्गत पर्ने जिल्लाका भू-क्षय, बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको दृष्टिकोणबाट बढी संवेदनशिल एवं प्राथमिकता प्राप्त उप-जलाधार क्षेत्रहरुमा स्थानीय समुदायको सहभागीतामा समूह मार्फत सञ्चालन गर्ने गरिन्छ । नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको श्रोत भएका सबै प्रकारका भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रमहरु प्रचलित ऐन, नीति, नियम र निर्दिष्ट निर्देशिका बमोजिम सघन रुपमा समूहको सक्रिय

सहभागीतामा सञ्चालन हुन्छन् । समस्याको संवेदनशिलताको आधारमा प्राथमिकता क्रममा पछाडि परेका उप-जलाधार क्षेत्रहरूमा पनि कार्यक्रम संचालन गर्ने गरिन्छ । मुख्यतया : भू-संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रमहरू निम्न प्रक्रिया अनुसार सञ्चालन हुन्छन:

- चालु आर्थिक वर्षको लागी नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेट तथा कार्यक्रम सरोकारवाला सम्पूर्णको उपस्थितिमा सार्वजनिकिकरण ।
- वार्षिक खरिद योजना तयारी ।
- तोकिएर आएका स्थान-विशेषका कार्यक्रमहरूको हकमा सम्बन्धित स्थानमा स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमन गरी समस्या, चाहना र आवश्यकताका आधारमा र प्याकेजमा आएका कार्यक्रमहरू प्राथमिकता प्राप्त उपजलाधार क्षेत्र एवं भू-क्षय, पहिरो तथा बाढी प्रभावित क्षेत्रहरूमा सरोकारवाला सम्पूर्णसंग आवश्यक समन्वय गरी सञ्चालन ।
- जल एवं जलवायुजन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट समस्याग्रस्त क्षेत्रहरूको स्थानीय तह (गाउँपालिका/नगरपालिका/वडा कार्यालय) बाट सिफारिस पत्र सहित समूहको निर्णय र निवेदन संकलन ।
- सम्बन्धित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमन, सम्भाव्यता अध्ययन तथा आधारभूत तथ्याङ्क संकलन ।
- डिजाइन, ड्रइङ, लागत इष्टिमेट तयारी एवं श्रोतको बाँडफाँड ।
- प्रचलित कानूनको परिधीमा वार्षिक खरिद योजनाअनुसार कार्यक्रमको कार्यन्वयन र सम्झौता
- सेवा प्रदायक/निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता समूहको सक्रिय सहभागीतामा कार्यक्रम कार्यान्वयन ।
- योजनाको आवधिक निरीक्षण तथा अनुगमन ।
- कार्यसम्पन्न पश्चात कार्यालयबाट सम्झौता बमोजिम काम भए नभएको नापजाँच ।
- सम्बन्धित स्थानीय तहबाट कार्यसम्पन्नको सिफारिस पत्र, योजनाको आय व्ययको सार्वजनिक सुनुवाईको प्रतिवेदन र अन्य आवश्यक कागजात सहित भुक्तानीका लागी निवेदन पेश ।
- समूह तथा सेवा प्रदायक/निर्माण व्यवसायीको बैङ्क खातामा रकम भुक्तानी ।
- उपभोक्ता समूह तथा सेवा प्रदायक/निर्माण व्यवसायीकै सहभागीतामा आवश्यक मर्मत सम्भार ।

कार्यालयको कार्यक्षेत्र फराकिलो हुनुका साथै भू-संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यक्रमहरूको माग धेरै हुने र उक्त मागहरू सम्बोधन गर्नका लागी कार्यालयमा पर्याप्त बजेट तथा कार्यक्रम नहुने हुँदा सम्बन्धित स्थानीय तह एवं अन्य निकायहरू संग आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गरी भू-संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यक्रमहरू साझेदारीमा समेत कार्यालयद्वारा सञ्चालन हुँदै आएका छन् र साझेदारीका रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कार्यालय प्रतिबद्ध समेत रहेको छ ।

खण्ड २: वार्षिक कार्यक्रम, बजेट तथा प्रगति


२.१ आ.व.२०८२/०८३ मा संचालित कार्यक्रम तथा प्रगति

कार्यालयको लक्ष्य प्राप्तीका लागी कार्यक्षेत्र अन्तर्गत पर्ने जिल्लाहरूमा समस्या, चाहना, आवश्यकता र संवेदनशिलताको आधारमा प्रदेश तथा संघिय सरकारबाट प्राप्त भएका देहाय बमोजिमका एकीकृत भू-संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरी चालु आ.व. २०८२/०८३ मा सम्पन्न गरिएको छ ।

२.१.१ लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट विनियोजित बजेट, कार्यक्रम तथा प्रगति विवरण

२.१.१.१ समग्र बजेट तथा कार्यक्रम- बजेट रु लाखमा

ब.उ.शी.नं.	बजेट उप शीर्षकको नाम	वार्षिक बजेट (रु लाख)	खर्च (रु लाख)	वित्तिय प्रगति (%)	भौतिक प्रगति (%)	कैफियत
३२९०००१४४	भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम	६५०	५३६.६६	८२.५६	९३%	
३२९०१०१३३	भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरु	१५९.९६	७२.५५	४५.३६	०	
३२९०१०१३४	भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरु	३.२	३.१७	९९.०२	०	
३२९९११३०४	जलाधार संरक्षण तथा सिमसार व्यवस्थापन कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)	७५	५७.५५	७६.७३	१००	
३२९९११२८४	वातावरण विभाग (संघ शसर्त अनुदान)	७५	५८.०८	७७.४५	१००	
३२९९११२५४	जडिबुटी विकास कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)	४	३.९२	९८.१३	१००	
३२९००१६४	वातावरण तथा जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम	२	१.९८	९९.०५	०	
जम्मा		९६९.१६	७३३.९१	७५.७		

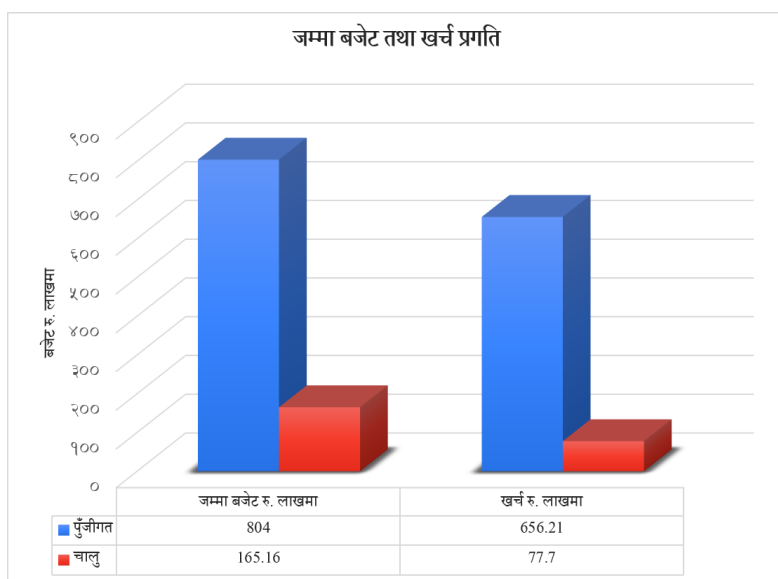

यस आर्थिक वर्षमा यस कार्यालयमा भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रमका जम्मा रु.७९३ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा प्रदेश सञ्चित कोषमा रकम अभावले गर्दा २० प्रतिशत बजेट रोक्का भई जम्मा रु. ६५० लाख मात्र खर्च गर्नलाई अख्तियारी प्राप्त भएको थियो । सो पश्चात यस कार्यालयलाई जम्मा अख्तियारी प्राप्त बजेट रु. ९६९.१६ लाख (पुँजीगत:८०४ लाख, चालु: १६५.१६ लाख) मध्ये जम्मा खर्च रु. ७३३.९१ लाख (पुँजीगत:६५६.२१ लाख, चालु: ७७.७ लाख) भएको छ । विनियोजित बजेट र खर्चको विश्लेषण गर्दा पुँजीगत खर्च ८१.६२ प्रतिशत, चालु खर्च ४७.०५ प्रतिशत र जम्मा वित्तीय प्रगति ७५.७ प्रतिशत देखिन्छ ।

२.१.१.२ भू-संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम


क्र.सं.	क्रियाकलापको नाम	बजेट रु.	खर्च रु.	वित्तीय प्रगति %	भौतिक प्रगति %
१	११.४.१७.१३२५ सेरा तटबन्धन योजना बगनासकाली गाउँपालिका ४ पाल्पा	५०००००	३९५७२७	७९.१५	१००.००
२	११.४.१७.१३२६ नयाँपाटी वस्ती संरक्षण, तानसेन न.पा. १० पाल्पा	७०००००	५५९५८४	७९.९४	१००.००
३	११.४.१७.१३२७ सेन माविमा पहिरो नियन्त्रणका लागि तटबन्धन, तानसेन न.पा. ६ पाल्पा	५०००००	३९६८६७	७९.३७	१००.००
४	११.४.१७.१३२८ निस्दी गा. पा. १ पाल्पामा एक गाउँ एक पोखरी(बर्षेपानी संकलन) निर्माण	३०००००	२३९७००	७९.९०	१००.००
५	११.४.१७.१३३० बरपोखरा संसारकोट पोखरी संरक्षण तथा व्यवस्थापन, रिब्दिकोट गाउँपालिका	३०००००	२३३८५६	७७.९५	१००.००
६	११.४.१७.१३३१ तिनाउखोला तटबन्धन तथा संरक्षण योजना, माथागढी गा. पा. ३ पाल्पा	५०००००	३७६५९४	७५.३२	१००.००
७	११.४.१७.१३३२ लुम्बिनी मावि पहिरो नियन्त्रण, तानसेन न.पा. १२ पाल्पा	५०००००	०	०.००	०.००
८	११.४.१७.१३३३ सत्यवती ताल संरक्षण, तिनाँउ गा. पा. ४ पाल्पा	५०००००	३८५२१२	७७.०४	१००.००
९	११.४.१७.१३३४ बजादी बस्ती माथीको पहिरो तटबन्धन, रैनाछहरा गा. पा. २ पाल्पा	१००००००	७८४३३४	७८.४३	१००.००
१०	११.४.१७.१३३५ रिचाज पोखरी निर्माण, माथागढी गाउँपालिका पाल्पा	३०००००	२३७२४६	७९.०८	१००.००
११	११.४.१७.१३३६ सत्यवती पोखरी संरक्षण तथा व्यवस्थापन, माथागढी गा. पा. ८ पाल्पा	५०००००	३९५३८८	७९.०८	१००.००
१२	११.४.१७.१३३७ छरछरे अर्धरी जलाधार संरक्षण, तानसेन न.पा. ९ पाल्पा	७०००००	५५४९१८	७९.२७	१००.००
१३	११.४.१७.१३३८ मनोहरापुर र रानीबारी पोखरी संरक्षण कार्यक्रम, बुटवल उपमन.पा. १९ रुपन्देही	३०००००	२३९८४९	७७.२८	१००.००
१४	११.४.१७.१३३९ कजरार नदि नियन्त्रण तथा तटबन्धन, देवदह नगरपालिका रुपन्देही	५०००००	३९४८१०	७८.९६	१००.००
१५	११.४.१७.१३४० डण्डा पुल नजिक रहेको हनुमान मन्दिरको किनारमा डण्डा नदिमा तटबन्धन निर्माण, ओमसतिया गा. पा. ४ रुपन्देही	५०००००	३९५११०	७९.०२	१००.००
१६	११.४.१७.१३४१ चारपाला सामुदायिक वनक्षेत्रमा तटबन्धन, बुटवल उपमन.पा. १२ रुपन्देही	१००००००	७८३५८९	७८.३६	१००.००
१७	११.४.१७.१३४२ मिलन पार्कमा पोखरी निर्माण तथा सतगढी २ खोला तटबन्धन, बुटवल उपमन.पा. १२ रुपन्देही	६०००००	४७३१९१	७८.८७	१००.००
१८	११.४.१७.१३४३ सुकौली खोलाको शिरमा भालु खोलामा रिचाज पोखरी निर्माण, सेनामैना न.पा. २ रुपन्देही	३०००००	२३७६१०	७९.२०	१००.००
१९	११.४.१७.१३४४ सार्वजनिक पोखरी संरक्षण तथा व्यवस्थापन, सियारी गा. पा. २ रुपन्देही	२०००००	१५८०९१	७९.०५	१००.००
२०	११.४.१७.१३४५ श्री लोकेश्वर मन्दिर परिसर र वस्ती संरक्षण तटबन्धन, देवदह नगरपालिका ५ रुपन्देही	५०००००	३८९६५७	७७.९३	१००.००
२१	११.४.१७.१३४७ टटेरा थारु गाउँ रोहणी नदिमा तटबन्धन, देवदह न.पा. ३ रुपन्देही	७०००००	५५२०७२	७८.८७	१००.००
२२	११.४.१७.१३४८ स्यालेझुके मलंगीहवा घोला तटबन्धन, देवदह न.पा. ८ रुपन्देही	५०००००	०	०.००	०.००
२३	११.४.१७.१३४९ कोटिहवा थारु गाउँको एतिहासिक पोखरी व्यवस्थापन, तिलोत्तमा न.पा. १५ रुपन्देही	५०००००	२४६१७५	४९.२४	१००.००
२४	११.४.१७.१३५० देबिनगर घोला तटबन्धन, तिलोत्तमा न.पा. १४ रुपन्देही	५०००००	०	०.००	०.००
२५	११.४.१७.१३५१ सतियामाई मन्दिर अगाडी रोहणी नदीमा तटबन्धन, ओमसतिया गा. पा. ५ रुपन्देही	६०००००	४७३७४४	७८.९६	१००.००
२६	११.४.१७.१३५२ बखलिया डाडा सिससार क्षेत्र पोखरी निर्माण व्यवस्थापन सौन्दर्यीकरण, तिलोत्तमा न.पा. १०	५०००००	०	०.००	०.००
२७	११.४.१७.१३५३ सिलौटिया मन्दिर निर रोहणी खोलामा तटबन्धन, ओमसतिया गा. पा. ५ रुपन्देही	७०००००	५५३६९७	७९.१०	१००.००
२८	११.४.१७.१३५४ जगाँहा १० विघा घोला नियन्त्रण तथा तटबन्धन, सुनवल न.पा. ११ नवलपरासी (ब.सु.प.)	१५०००००	८९६१७५	५९.७५	१००.००
२९	११.४.१७.१३५५ गणेशपुर धनेवा खोलामा तटबन्धन निर्माण, सरावल गा. पा. ७ नवलपरासी (ब.सु.प.)	१००००००	७७८८५४	७७.८९	१००.००
३०	११.४.१७.१३५६ रजहवा वनवाटिकाको दक्षिण तटबन्धन निर्माण, सरावल गा. पा. १ नवलपरासी (ब.सु.प.)	१००००००	८१०३५६	८१.०४	१००.००
३१	११.४.१७.१३५७ पुसाहा खोला र भोलावास खोला तटबन्धन, सुनवल न.पा. ६ नवलपरासी (ब.सु.प.)	१००००००	७९४८४५	७९.४८	१००.००
३२	११.४.१७.१३५८ पट्खोली पुल देखि उत्तर तर्फ सरावलको सिमाना पूर्व दक्षिण नदी नियन्त्रण, रामग्राम न.पा. १७	१००००००	७९०२१०	७९.०२	१००.००
३३	११.४.१७.१३५९ भुसनापुर पुल देखि दक्षिण विधालयको जग्गा भुक्षय नियन्त्रण तथा तटबन्धन, रामग्राम न.पा.	५०००००	३९४८५८	७८.९७	१००.००
३४	११.४.१७.१३६० तुरिया नदिमा बनाईएको पुल देखि पश्चिम दक्षिण १०० मि पछि तुरिया नदि नियन्त्रण	१००००००	७९२६१७	७९.२६	१००.००
३५	११.४.१७.१३६१ महाउ खोलामा तटबन्धन रामग्राम न.पा. १६ नवलपरासी (ब.सु.प.)	५०००००	३९६०७७	७९.२२	१००.००
३६	११.४.१७.१३६२ जनता मावि डैनाहवा धिबल पुलको उत्तर पट्टि तटबन्धन तुरिया नदी रामग्राम न.पा. १४	५०००००	३९४१००	७८.८२	१००.००
३७	११.४.१७.१३६३ कुस्हा खोलामा भुक्षय तटबन्धन, पाल्हीनन्दन गा. पा. ४ नवलपरासी	५०००००	३९३६५०	७८.७३	१००.००
३८	११.४.१७.१३६४ झरि खोलामा नदी तटबन्धन निर्माण, रामग्राम नगरपालिका नवलपरासी (ब.सु.प.)	१००००००	७९२५१९	७९.२५	१००.००
३९	११.४.१७.१३६५ दिव्य शान्ति ईको पार्कमा तटबन्धन र सौन्दर्यीकरण, बर्दघाट न.पा. ४ नवलपरासी (ब.सु.प.)	५०००००	३९६६६६	७९.३३	१००.००
४०	११.४.१७.१३६६ फेचुहा बन्धारी टोलको खोलाको उत्तर तर्फ तटबन्धन, खोला नियन्त्रण, सुस्ता गा. पा. १	१००००००	७९५१२९	७९.५१	१००.००
४१	११.४.१७.१३६७ कर्महना टोलको खोलाको पूर्व तर्फको तटबन्धन ४० मी लम्बाई, सुस्ता गा. पा. १ नवलपरासी	५०००००	३९५६४३	७९.१३	१००.००
४२	११.४.१७.१३७० धनेवा नदी कटान नियन्त्रण रामग्राम न.पा. १७ नवलपरासी (ब.सु.प.)	१००००००	७९१६६९	७९.१७	१००.००
४३	११.४.१७.१३७१ चोर्निया खोलामा नर्सरी जाने बाटोको पुल देखि उत्तर पूर्व तटबन्धन, प्रतापपुर गाउँपालिका ८	१००००००	७९५३३७	७९.५३	१००.००
४४	११.४.१७.१३७२ टिकाराम चापागाईंको घर देखि पश्चिम तटबन्धन, बर्दघाट नगरपालिका ०७ नवलपरासी (ब.सु.प.)	५०००००	३९१९५७	७८.३९	१००.००
४५	११.४.१७.१३७३ नव जीवन पार्क बाढिप्रति संरक्षण, बर्दघाट ४ नवलपरासी (ब.सु.प.)	५०००००	३९७१०१	७९.४२	१००.००
४६	११.४.१७.१३७४ झरही नदी नियन्त्रण कुर्थावल पुलपारी सरावल ६ नवलपरासी (ब.सु.प.)	१००००००	७८९०७६	७८.९१	१००.००
४७	११.४.१७.१३७५ दिव्यनगर खोला तटबन्धन पार्क नजिक, बर्दघाट ४ नवलपरासी (ब.सु.प.)	१५०००००	८१२६७०	५४.१८	१००.००
४८	११.४.१७.१३७६ बेलहानी खानेपानी ट्याङ्की पछाडी जलाशय निर्माण बर्दघाट ५ नवलपरासी (ब.सु.प.)	१००००००	७९५७६९	७९.५८	१००.००
४९	११.४.१७.१३७७ लेकको सामुदायिक वनमा पोखरी निर्माण, रिब्दिकोट गा. पा. २ पाल्पा	५०००००	३८६३१९	७७.२६	१००.००
५०	११.४.१७.१३७८ वृन्दावन सामुदायिक वनमा पोखरी निर्माण, रिब्दिकोट गा. पा. २ पाल्पा	५०००००	३९९५००	७९.९०	१००.००
५१	११.४.१७.१३८० जुकेखोला जलाशय निर्माण, रिब्दिकोट गा. पा. २ पाल्पा	१००००००	७९०११०	७९.०१	१००.००
५२	११.४.१७.१३८१ श्री नगर बतासेडाँडा पानी पोखरी निर्माण, तानसेन न.पा. पाल्पा	५०००००	३९५९७३	७९.१९	१००.००
५३	११.४.१७.१३८२ ग्याङ्गदी खोलामा तटबन्धन निर्माण सुनवल नगरपालिका ०४ नवलपरासी (ब.सु.प.)	१००००००	७९५६५३	७९.५७	१००.००
५४	११.४.१७.१३८३ रतनपुरा देखि सुर्यपुरा पावरहाउस पश्चिम खोलामा पूर्वतिर तटबन्धन, प्रतापपुर गा.पा. ७	५०००००	३९४०९२	७८.८२	१००.००
५५	११.४.१७.१३८४ नगरस्तरिय दलित भवन सुनवल नजिक चारधरे कुलोमा तटबन्धन, सुनवल नगरपालिका	५०००००	३९८१३०	७९.६३	१००.००
क्र.सं.	क्रियाकलापको नाम	बजेट रु.	खर्च रु.	वित्तीय प्रगति %	भौतिक प्रगति %

५६	११.४.१७.१३८५ रायपुरवा खोला नेपाली नहरको पुल देखि उत्तर तिर तटबन्धन, सुस्ता गा.पा. १ नवलपरासी	१५०००००	८९२३६०	५९.४९	१००.००
५७	११.४.१७.१३८६ सयपत्रि नेपाल विद्यालय पछाडी खोलामा तटबन्धन बर्दघाट १४ नवलपरासी (ब.सु.प.)	१५०००००	८९९६३२	५९.९८	१००.००
५८	११.४.१७.१३८७ आकस्मिक विपद व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरण (तारजाली खरिद समेत)	५००००००	३९६८३९७	७९.३७	१००.००
५९	११.४.१७.१६९५ जनीरा टोल देखि रोहिणी पुलको उत्तरसम्मको खोला तटबन्धन योजना, देवदह नगरपालिका	२००००००	१६५९८९०	८२.९९	१००.००
६०	११.४.१७.१७०५ झुम्सा लम्दुवा सडक क्षेत्रमा पहिरो संरक्षण, तिनाउ गा. पा. ३ पाल्पा	७०००००	५५६४३४	७९.४९	१००.००
६१	११.४.१७.१७०६ सुनवल हिलपाक भित्र पहिरो संरक्षण, सुनवल नगरपालिका ०१ नवलपरासी (ब.सु.प.)	७०००००	५३३८७८	७६.२७	१००.००
६२	११.४.१७.१७०७ इंगुरिया नदिमा तटबन्धन निर्माण, दमकडागैडहवा-०९ (रुपन्देही), सैनामैना -०८ (रुपन्देही),	७५०००००	५१३५०४०	६८.४७	१००.००
६३	११.४.१७.१७०८ मण्डरखानी तटबन्धन निर्माण, गैडहवा-०९ (रुपन्देही)	१००००००	७९४५७८	७९.४६	१००.००
६४	११.४.१७.१७०९ बाँसगढी घोलामा तटबन्धन, सैनामैना-१ (रुपन्देही)	७०००००	०	०.००	०.००
६५	११.४.१७.१७१० रिचार्ज पोखरी निर्माण, बरपानी सामुदायिक बन, सैनामैना -९ (रुपन्देही)	३०००००	२३८२४८	७९.४२	१००.००
६६	११.४.१७.१७११ बनराह खोला तटबन्धन निर्माण, सैनामैना -९ (रुपन्देही)	१००००००	७७६०००	७७.६०	१००.००
६७	११.४.१७.१७१३ रिचार्ज पोखरी निर्माण, पहिला खोला सामुदायिक बन, सैनामैना १० र ११ (रुपन्देही)	३०००००	२३८८००	७७.६०	१००.००
६८	११.४.१७.१७१४ झिमपुर पहिला नदि तटबन्धन, सैनामैना-१० (रुपन्देही)	१००००००	७९९९४४	७९.३९	१००.००
६९	११.४.१७.१७१५ तुलबुलिया तटबन्धन, सैनामैना-०५ (रुपन्देही)	९०००००	६४३७३२	७१.५३	१००.००
७०	११.४.१७.१७१६ दानब नदिमा तटबन्धन गैडहवा-०८ (रुपन्देही)	२००००००	१३०८९४७	६५.४५	१००.००
७१	११.४.१७.१७१७ कञ्चन नदिमा तटबन्धन निर्माण, गैडहवा, ०६ (रुपन्देही)	१००००००	९९४०१६	९९.४०	१००.००
७२	११.४.१७.१७१८ बनकट्टी टोल तटबन्धन सैनामैना-११ (रुपन्देही)	७०००००	५५२५४७	७८.१४	१००.००
७३	११.४.१७.१७१९ दानापुर पहिला नदि तटबन्धन, कञ्चन-०१ (रुपन्देही)	७०००००	६८१५३२	९७.७९	१००.००
७४	११.४.१७.१७२० कञ्चन नदि तटबन्धन, सैनामैना १० र ११ (रुपन्देही)	७०००००	६८११२५	९७.३०	१००.००
७५	११.४.१७.१७२२ हाथोक बजार पहिरो नियन्त्रण, रिब्दीकोट ३ पाल्पा	७०००००	६७९३६५	९७.०५	१००.००
७६	११.४.१७.१८०९ शिवालय परिसरमा जलाशय निर्माण, सिद्धार्थनगर ८ रुपन्देही	१००००००	०	०.००	०.००
७७	११.४.१७.१८१० तानसेन चहारे खोला पक्की पुल नजिक खेत तथा बस्ति संरक्षण तटबन्धन, बगनासकाली १, पाल्पा	७०००००	५४८८३६	७८.४१	१००.००
७८	११.४.१७.१८१५ खोलाको छेउछेउमा बाँस रोपण तथा वायो इन्जिनियरिङ कार्य, रामग्राम न.पा. १७ नवलपरासी	५०००००	३९५१८०	७९.०४	१००.००
७९	११.४.१७.१८१६ वायोइन्जिनियरिङ प्रविधि प्रयोग गरी चिसापानी खोला संरक्षण, दिव्यज्योती क्याम्पस, बर्दघाट नगरपालिका ०२ चिसापानी, नवलपरासी (ब.सु.प.)	५०००००	३८९६७८	७७.९४	१००.००
८०	११.४.१७.१८१७ सुस्ता ५ सुस्ता नारायणी नदीको किनारमा बास (राईजोम) रोपण, सुस्ता गा. पा. १ नवलपरासी	५०००००	३९५१८०	७९.०४	१००.००
८१	११.४.१७.१८१८ उपजलाधार क्षेत्रको प्राथमिकीकरण	३५००००	३४१८२५	९७.६६	१००.००
८२	११.४.१७.१८१९ Activity Profile तयारी	१५००००	१४८७०८	९९.१४	१००.००
८३	११.४.१७.१८२५ लुम्बिनी मा.वि पछाडी पहिरो नियन्त्रण, तानसेन न.पा १२ बौद्धपोखराथोक पाल्पा	३००००००	२००४५२९	६६.८२	१००.००
८४	११.४.१७.१८४६ कालिगण्डकी तटबन्धन निर्माण तानसेन १४ पाल्पा	१५०००००	८१२४७१	५४.१६	१००.००
८५	११.४.१७.१८४७ लुम्दीखोला भू संरक्षण तथा बस्ती संरक्षण रैनादेवी २ पाल्पा	१५०००००	०	०.००	०.००
८६	११.४.१७.१८४८ बजादी सदैवा बस्ती संरक्षण पहिरो रोकथाम रिब्दीकोट ५ पाल्पा	३००००००	०	०.००	०.००
	जम्मा	७९३०००००	५३६६५९४५	६७.६७	९०.७०
	२० प्रतिशत रोकका पश्चात	६५००००००	५३६६५९४५	८२.५६	९०.७०

यस आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राप्ती उपत्यका (देउखुरी), नेपालद्वारा भू-संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि ८६ वटा योजनाहरूमा ७ करोड ९३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। यसै सन्दर्भमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, राप्ती उपत्यका (देउखुरी), नेपालको मिति २०८२/०६/२९ च.नं. २१४ को पत्रानुसार विनियोजित बजेटको २० प्रतिशत रकम रोकका भई जम्मा रु. ६ करोड ५० लाख अख्तियारी प्राप्त भई ७८ वटा योजना कार्यान्वयन भई जम्मा रु. ५,३६,६५,९४५ खर्च भई ८२.५६ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल भएको छ भने सबै कार्यान्वयन भएका योजनाहरूमा शत प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भएको देखिन्छ। कार्यान्वयन हुन नसकेका ८ योजनाहरूको विश्लेषण गर्नुपर्दा ३ वटा योजनाहरूको ठेगाना फरक भएकाले संशोधनका लागि तालुक निकायमा पेश गरिएकोमा योजना संशोधन भई अख्तियारी प्राप्त नभएको, एउटा योजना दोहोरीएको कारण कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त नभएको र बाँकी ४ वटा योजनाहरूको अनुपयुक्त स्थानमा बजेट विनियोजन भएकाले कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त नठहरिएकाले योजनाहरू कार्यान्वयन हुन सकेनन्। जम्मा ८६ वटा योजनाहरूमा वजेट विनियोजन भएको तर ७८ वटा योजनाहरू मात्र कार्यान्वयन भएको अवस्था हेर्दा जम्मा भौतिक प्रगति ९०.७ प्रतिशत देखिन्छ।

२.१.१.३ जलाधार संरक्षण तथा सिमसार व्यवस्थापन र वातावरण विभाग कार्यक्रम (संघ सशर्त अनुदान)

क्र.सं.	क्रियाकलापको नाम	बजेट रु.	खर्च रु.	वित्तीय प्रगति %	भौतिक प्रगति %
आयोजना/कार्यक्रम नाम: ३२९९११३०४ जलाधार संरक्षण तथा सिमसार व्यवस्थापन कार्यक्रम (संघ सशर्त अनुदान)					
१	11.4.14.78 रिडी खोला नियन्त्रण तथा तटबन्ध तानसेन न पा १४ अर्गेली कुसेनी पाल्पा	२५०००००	१६२१०६५	६४.८४	१००.००
२	11.4.17.1750 रुद्रवेणी बडीगाड तटबन्ध, सत्यवती १, गुल्मी र बर्दघाट खानेपानी तथा जलाधार संरक्षण, बर्दघाट, नवलपरासी	२५०००००	१८०७२४३	७२.२९	१००.००
३	11.4.17.1764 रामघाट पहिरो संरक्षण, रामपुर ५ र अघेरी पहिरो नियन्त्रण तानसेन ९ पाल्पा	२५०००००	२३२६६४०	९३.०७	१००.००
जम्मा		७५०००००	५७५४९४८	७६.७३	१००.००
आयोजना/कार्यक्रम नाम: ३२९९११२५४ जडिबुटी विकास कार्यक्रम (संघ सशर्त अनुदान)					
१	11.4.17.1790-कृषि वन प्रणाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम (सामुदायिक तथा कवुलियती वनमा फलफूल तथा बहुउपयोगि विरुवा रोपण तथा संरक्षण)	४०००००	३९२४००	९८.२३	१००
जम्मा		४०००००	३९२४००	९८.२३	१००
आयोजना/कार्यक्रम नाम: ३२९९११२८४ वातावरण विभाग (संघ सशर्त अनुदान)					
१	11.4.17.1749 बोटानिकल पार्क निर्माण, रुपन्देही र तिलोत्तमा सामुदायिक पार्क निर्माण तथा व्यवस्थापन तिलोत्तमा ६ रुपन्देही	५००००००	३५१४१८८	७०.२८	१००.००
२	11.4.17.1803 ज्याग्दी पर्यावरण संरक्षण पार्क निर्माण, रामपुर ६, र हरियाली पार्क निर्माण, बङ्गशगोपाल, तानसेन नगरपालिका ७, प्रभास, पाल्पा	२५०००००	२२९४२५५	९१.७७	१००.००
जम्मा		७५०००००	५८०८४४३	७७.४५	१००.००
कूल जम्मा		१५४०००००	११९५५८९१	७७.६४	१००.००

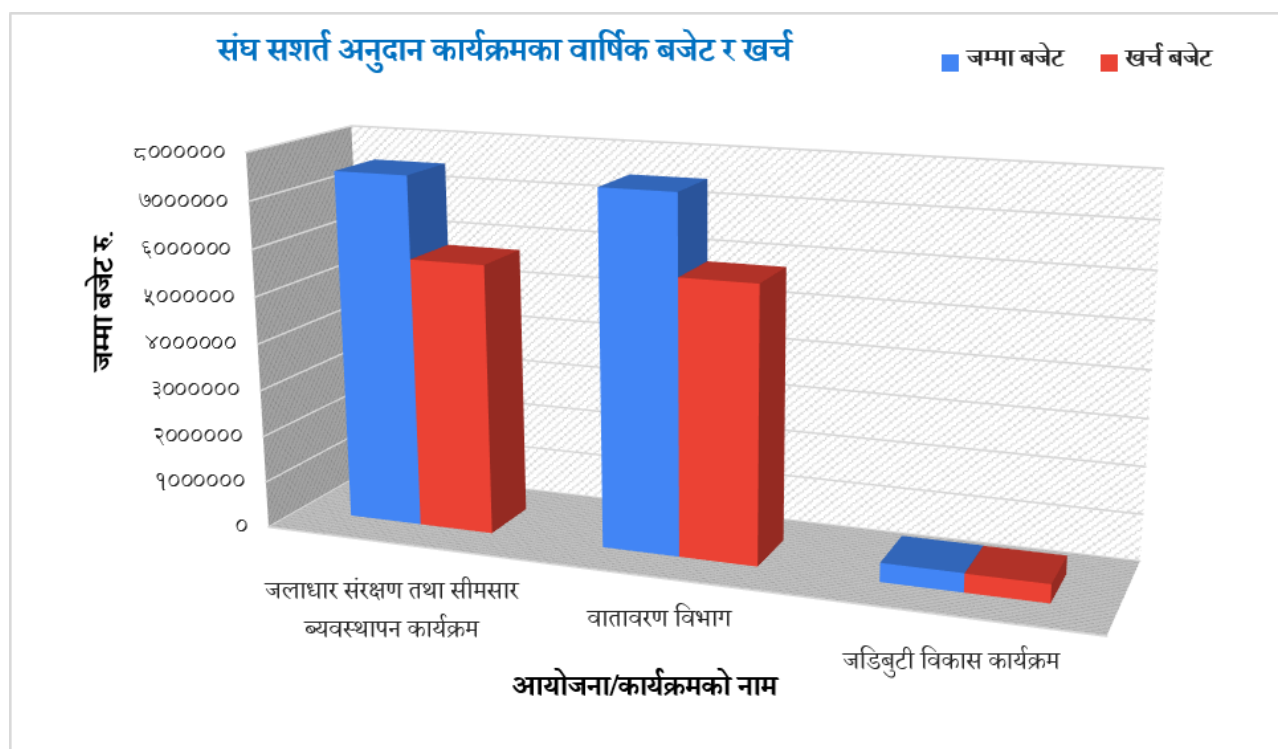

संघ सशर्त कार्यक्रमहरु तर्फ हेर्दा यस कार्यालयमा अख्तियारी प्राप्त ३ वटा बजेट उपशीर्षक: जलाधार संरक्षण तथा सिमसार व्यवस्थापन कार्यक्रम, वातावरण विभाग र जडिबुटी विकास कार्यक्रम तर्फ ६ वटा क्रियाकलापमा जम्मा रु. १ करोड ५४ लाख बिनियोजन भएकोमा जम्मा रु. १,१९,५५,८९१ खर्च भई ७७.६४ प्रतिशत वित्तीय प्रगति र १०० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भएको छ ।

खण्ड ३: संरक्षण पार्श्वचित्र

३.१ पाल्पा जिल्लामा संचालित कार्यक्रमहरूको पार्श्वचित्र

कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: सेरा तटबन्धन योजना

स्थान: बगनासकाली गाउँपालिका ४, पाल्पा

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.८९२२०५ देशान्तर: ८३.६४१०५

उद्देश्य: भू क्षय नियन्त्रण गर्नुका साथै गल्छीले गर्दा जोखिममा रहेको जग्गा जमिनको संरक्षण

निर्माण गरिएको संरचना: २३ गोटा ग्याबियन चेकड्याम (५२ घ.मि.)

कार्यान्वयन प्रक्रिया: खरिदको लागि दररेट माग

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: ३८५५१९

प्रभावकारिता: गल्छी नियन्त्रण तथा रोकथाम भई ०.२५ हे. जग्गा जमिनको संरक्षण

लाभान्वित घरधुरी: १५

रोजगारी श्रृजना: ३८ श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार १ वर्ष सम्म सम्बन्धित फर्म स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: लाङघाली एस. बि. बिल्डर्स सप्लायर्स, किर्तिपुर १

संचालकको नाम: खुम बहादुर सारु

साइट इन्चार्ज: सन्दीप चौधरी (व.भू.सं.अ)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: सेन मा.वि.मा पहिरो नियन्त्रणका लागि तटबन्धन

स्थान: तानसेन न.पा. ६, पाल्पा

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.८६५५०२ देशान्तर: ८३.५५१९०७

उद्देश्य: पहिरोको जोखिममा रहेको जग्गा जमिनको संरक्षण

निर्माण गरिएको संरचना: सिमेन्ट ढुङ्गाको टेवा पर्खाल (२०*१.१५*१.) मिटर १९.९९ घ.मि.

कार्यान्वयन प्रक्रिया: खरिदको लागि दररेट माग

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: ३८६६६७

प्रभावकारिता: जग्गा जमिनको संरक्षण

लाभान्वित घरधुरी: बिद्यालय परिवार

रोजगारी श्रृजना: ६८ श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार १ वर्ष सम्म सम्बन्धित फर्म स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: श्री सुरेन्द्र निर्माण सेवा, तानसेन, पाल्पा

संचालकको नाम: सुरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ

साइट इन्चार्ज: बालकृष्ण कार्की (इन्जिनियर)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: नयाँपाटी वस्ती संरक्षण

स्थान: तानसेन न.पा. १०, पाल्पा

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.८२४१२६ देशान्तर: ८३.५३७१५८

उद्देश्य: खोला कटान नियन्त्रण गर्नुका साथै कटानले गर्दा जोखिममा रहेको जग्गा जमिन संरक्षण

निर्माण गरिएको संरचना: सिमेन्ट ढुङ्गाको टेवा पर्खाल (१३.८७*१.४*२.५) मिटर ३२.०७ घ.मि.

कार्यान्वयन प्रक्रिया: खरिदको लागि दररेट माग

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: ५४३२८६

प्रभावकारिता: खोला कटान नियन्त्रण जग्गा जमिनको संरक्षण

लाभान्वित घरधुरी: ३२

रोजगारी श्रृजना: ८९ श्रमदिन



मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार १ वर्ष सम्म सम्बन्धित फर्म स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: श्री तावाश्री निर्माण सेवा

संचालकको नाम: प्रताप कुमार गिरि

साइट इन्चार्ज: बालकृष्ण कार्की (ईन्जिनियर)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:

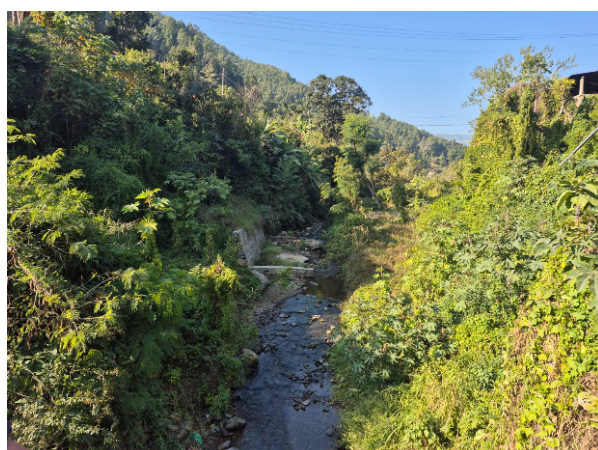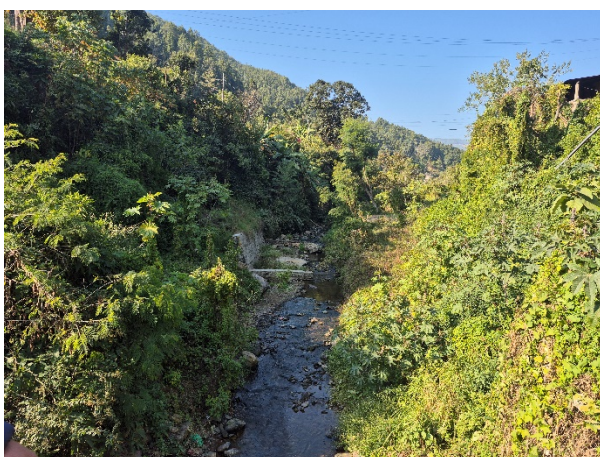

कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: छरछरे अधेरी जलाधार संरक्षण

स्थान: तानसेन न.पा. ९, पाल्पा

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.८२३४६२ देशान्तर: ८३.५६७२७६

उद्देश्य: आकाशे तथा भलपानी संकलन गर्नुका साथै जमिनमूनि जल पुनर्भरण गरी भूमिगत पानीको सतह वृद्धि गर्न

निर्माण गरिएको संरचना: ग्याबिन जालीको ४ ओटा चेक ड्याम निर्माण कार्य ८३ घ.मि.

कार्यान्वयन प्रक्रिया: खरिदको लागि दररेट माग

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: ५४११२८

प्रभावकारिता: खोला कटान नियन्त्रण जग्गा जमिनको संरक्षण

लाभान्वित घरधुरी: १७

रोजगारी श्रृजना: ७० श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार १ वर्ष सम्म सम्बन्धित फर्म स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी

कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: श्री अवि कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि., रामपुर ०५, पाल्पा

संचालकको नाम: अभिनास रेग्मी

साइट इन्चार्ज: बालकृष्ण कार्की (ईन्जिनियर)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: जुकेखोला जलासय निर्माण

स्थान: रिब्दिकोट गा. पा. २, पाल्पा

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.९०२२२२७ देशान्तर: ८३.४४५६३९४

उद्देश्य: आकाशे तथा भलपानी संकलन गर्नुका साथै जमिनमूनि जल पुनर्भरण गरी भूमिगत पानीको सतह वृद्धि गर्न निर्मा

ण गरिएको संरचना: रिचार्ज पोखरी स्टोन मेसिनरी वाल (४०.७५*०.८*१) मिटर, ३२.६ घ.मि.

कार्यान्वयन प्रक्रिया: खरिदको लागि दररेट माग

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: ७७०५१०

प्रभावकारिता: खोला कटान नियन्त्रण जग्गा जमिनको संरक्षण

लाभान्वित घरधुरी: १५

रोजगारी श्रृजना: ९६ श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार १ वर्ष सम्म सम्बन्धित फर्म स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: श्री एस.आर. निर्माण सेवा, कपिलवस्तु

संचालकको नाम: लिला शर्मा

साइट इन्चार्ज: बालकृष्ण कार्की (ईन्जिनियर)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: झुम्सा लग्दुवा सडक क्षेत्रमा पहिरो संरक्षण

स्थान: तिनाउ गा. पा. ३, पाल्पा

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.७५७५८९ देशान्तर: ८३.४९५११

उद्देश्य: भू क्षय नियन्त्रण गर्नुका साथै पहिरोले गर्दा जोखिममा रहेको जग्गा जमिनको संरक्षण

निर्माण गरिएको संरचना: ३ तह ८४.५ घ.मि. को २२ मिटर ग्याबियन ग्याबियन तटबन्ध निर्माण

कार्यान्वयन प्रक्रिया: खरिदको लागि दररेट माग

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: ५४२६४८

प्रभावकारिता: पहिरो नियन्त्रण तथा रोकथाम जग्गा जमिनको संरक्षण

लाभान्वित घरधुरी: १८

रोजगारी श्रृजना: ७५ श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार १ वर्ष सम्म सम्बन्धित फर्म स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी

कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: श्री वाइ.पि. निर्माण सेवा

संचालकको नाम: यज्ञ प्रसाद पौडेल

साइट इन्चार्ज: बालकृष्ण कार्की (ईन्जिनियर)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: श्री नगर बतासेडाँडा पानी पोखरी निर्माण

स्थान: तानसेन न.पा. ५, पाल्पा

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.८७३३७२ देशान्तर: ८३.५३५२८५

उद्देश्य: आकाशे तथा भलपानी संकलन गर्नुका साथै जमिनमूनि जल पुनर्भरण गरी भूमिगत पानीको सतह वृद्धि गर्न निर्माण गरिएको संरचना: रिचार्ज पोखरी स्टोन पिचिड (८०*२*०.२) मिटर, ३२ घ.मि.

कार्यान्वयन प्रक्रिया: खरिदको लागि दररेट माग

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: ३८५७७१

प्रभावकारिता: आकाशे तथा भलपानी संकलन भई जमिनमूनि जल पुनर्भरण र भूमिगत पानीको सतह वृद्धिमा टेवा पुगेको
लाभान्वित घरधुरी: क्याम्पस परिवार **रोजगारी श्रृजना:** ११३ श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भा १ वर्षसम्म सम्बन्धित फर्म स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५% धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: स्वर्गद्वारी कन्स्ट्रक्सन, पाल्पा

संचालकको नाम: भुवन भट्टराई

साइट इन्चार्ज: बालकृष्ण कार्की (इन्जिनियर)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: आकस्मिक विपद व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरण (तारजाली खरिद समेत)

स्थान: पाल्पा, रुपन्देही र नवलपरासी

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क:

उद्देश्य: आकस्मिक विपद व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरण

निर्माण गरिएको संरचना: ३५६ थान (१.५*१*१) मिटरको मेसिम मेड ग्याबियन बक्स गरिद ।

कार्यान्वयन प्रक्रिया: खरिदको लागि दररेट माग

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: ९६४४३७

प्रभावकारिता: आकस्मिक विपद व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरणका लागि तारजाली वितरण

लाभान्वित घरधुरी: २००

रोजगारी श्रृजना:

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार सम्बन्धित उपभोक्ता समुह र व्यक्तिबाट हुनेछ ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: श्री ग्याबिन बक्स नेपाल प्रा.लि.

साइट इन्चार्ज: बालकृष्ण कार्की (ईन्जिनियर)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: एक गाउँ एक पोखरी (बर्षेपानी संकलन) निर्माण

स्थान: निस्दी गा. पा. १, पाल्पा

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.७७०१२३ देशान्तर: ८३.९२१२२५

उद्देश्य: आकाशे तथा भलपानी संकलन गर्नुका साथै जमिनमूनि जल पुनर्भरण गरी भूमिगत पानीको सतह वृद्धि गर्न

निर्माण गरिएको संरचना: रिचार्ज पोखरी (१५*१०*१) मिटर, १५० घ.मि.

कार्यान्वयन प्रक्रिया: उपभोक्ता समिति मार्फत ।

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: २३२८०० उपभोक्ताको तर्फबाट रु: २९९२९

प्रभावकारिता: आकाशे तथा भलपानी संकलन भई जमिनमूनि जल पुनर्भरण र भूमिगत पानीको सतह वृद्धिमा टेवा पुगेको

लाभान्वित घरधुरी: ५५

रोजगारी श्रृजना: ८७ श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार उपभोक्ता समिती स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

उपभोक्ता समितिको नाम: श्री तल्लो बाका खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति, निस्दी ०१, पाल्पा

अध्यक्षको नाम: शालिकराम पाण्डे

साइट इन्चार्ज: बालकृष्ण कार्की (ईन्जिनियर)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: वृन्दावन सामुदायिक वनमा पोखरी निर्माण

स्थान: रिब्दीकोट गा. पा. २, पाल्पा

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.८९३४८७ देशान्तर: ८३.४५७१५३

उद्देश्य: आकाशे तथा भलपानी संकलन गर्नुका साथै जमिनमूनि जल पुनर्भरण गरी भूमिगत पानीको सतह वृद्धि गर्न

निर्माण गरिएको संरचना: रिचार्ज पोखरी (७*७*२) मिटर, ९८ घ.मि. , ६ मि १२ घ.मि. ग्याबियन वाल, ढुङ्गा सोलिड र २८ मि १४ घ.मि. स्टोन मेसिनरी वाल निर्माण ।

कार्यान्वयन प्रक्रिया: उपभोक्ता समिति मार्फत ।

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: २३२८०० उपभोक्ताको तर्फबाट रु: २९९२९

प्रभावकारिता: आकाशे तथा भलपानी संकलन भई जमिनमूनि जल पुनर्भरण र भूमिगत पानीको सतह वृद्धिमा टेवा पुगेको

लाभान्वित घरधुरी: पर्यटकहरु

रोजगारी श्रृजना: ५६ श्रमदिन


मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार उपभोक्ता समिति स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागि कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

उपभोक्ता समितिको नाम: श्री वृन्दावन सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति

अध्यक्षको नाम: मति बहादुर थापा

साइट इन्चार्ज: बालकृष्ण कार्की (ईन्जिनियर)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:

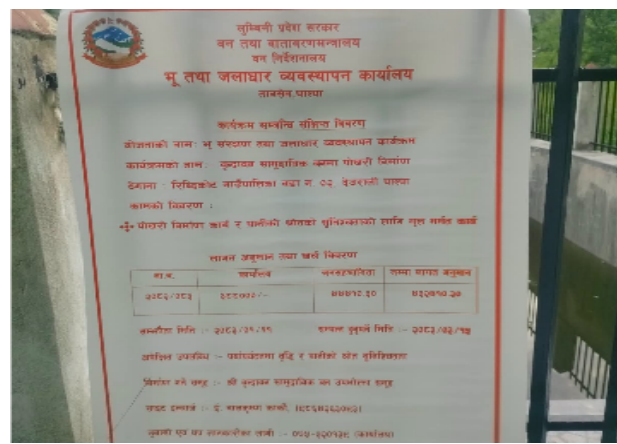

कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: सत्यवती पोखरी संरक्षण तथा व्यवस्थापन

स्थान: माथागढी गा. पा. ८, पाल्पा

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.७५०६१६ देशान्तर: ८३.७३४५२३

उद्देश्य: आकाशे तथा भलपानी संकलन गर्नुका साथै जमिनमूनि जल पुनर्भरण गरी भूमिगत पानीको सतह वृद्धि गर्न

निर्माण गरिएको संरचना: रिचार्ज पोखरी पर्खाल निर्माण (२०*१.१५*१) मिटर, १९.९९ घ.मि.

कार्यान्वयन प्रक्रिया: खरिदको लागि दररेट माग

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: ३८५१८८

प्रभावकारिता: आकाशे तथा भलपानी संकलन भई जमिनमूनि जल पुनर्भरण र भूमिगत पानीको सतह वृद्धिमा टेवा पुगेको

लाभान्वित घरधुरी: ३०

रोजगारी श्रृजना: ९८ श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार १ वर्ष सम्म सम्बन्धित फर्म स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: श्री के.एच.डि. निर्माण सेवा, नवलपरासी

संचालकको नाम: धिरज खनाल

साइट इन्चार्ज: बालकृष्ण कार्की (इन्जिनियर)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर :



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: बरपोखरा संसारकोट पोखरी संरक्षण तथा व्यवस्थापन

स्थान: रिब्दिकोट गाउँपालिका

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.८९५८६८ देशान्तर: ८३.४४७३५९

उद्देश्य: आकाशे तथा भलपानी संकलन गर्नुका साथै जमिनमूनि जल पुनर्भरण गरी भूमिगत पानीको सतह वृद्धि गर्न

निर्माण गरिएको संरचना: रिचार्ज पोखरी (१८*१०*२) मिटर, ३६० घ.मि.

कार्यान्वयन प्रक्रिया: खरिदको लागि दररेट माग

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: २२७८०७

प्रभावकारिता: आकाशे तथा भलपानी संकलन भई जमिनमूनि जल पुनर्भरण र भूमिगत पानीको सतह वृद्धिमा टेवा पुगेको

लाभान्वित घरधुरी: ५०

रोजगारी श्रृजना: ९५ श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार १ वर्ष सम्म सम्बन्धित फर्म स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: श्री के.एच.डि. निर्माण सेवा, नवलपरासी

संचालकको नाम: धिरज खनाल

साइट इन्चार्ज: बालकृष्ण कार्की (इन्जिनियर)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: रिचार्ज पोखरी निर्माण

स्थान: माथागढी गाउँपालिका, पाल्पा

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.७५०६८ देशान्तर: ८३.७३४७८६

उद्देश्य: आकाशे तथा भलपानी संकलन गर्नुका साथै जमिनमूनि जल पुनर्भरण गरी भूमिगत पानीको सतह वृद्धि गर्न

निर्माण गरिएको संरचना: रिचार्ज पोखरी पर्खाल निर्माण (१८.२*०.५५*१.५) मिटर, १५.०२ घ.मि.

कार्यान्वयन प्रक्रिया: खरिदको लागि दररेट माग

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: २३११२२

प्रभावकारिता: आकाशे तथा भलपानी संकलन भई जमिनमूनि जल पुनर्भरण र भूमिगत पानीको सतह वृद्धिमा टेवा पुगेको

लाभान्वित घरधुरी: ३०

रोजगारी श्रृजना: ९७ श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार १ वर्ष सम्म सम्बन्धित फर्म स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी

कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: श्री के.एच.डि. निर्माण सेवा, नवलपरासी

संचालकको नाम: धिरज खनाल

साइट इन्चार्ज: बालकृष्ण कार्की (इन्जिनियर)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: रामघाट पहिरो संरक्षण र अधेरी पहिरो नियन्त्रण

स्थान: रामपुर ५ र तानसेन ९, पाल्पा

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क:

अक्षांश: २७.८७६२७८

देशान्तर: ८३.९१११९८

अक्षांश: २७.८२४११२

देशान्तर: ८३.५६४८६

उद्देश्य: खोला कटानबाट निर्मित पहिरो नियन्त्रण र जोखिममा रहेको जग्गा जमिन संरक्षण

निर्माण गरिएको संरचना: २ तह १७४.५ घ.मि. को ५ ओटा ग्याबियन ग्याबियन चेकड्याम र (६०*२*३) मि २३७.५ घ.मि. ग्याबियन टेवा पर्खाल निर्माण ।

कार्यान्वयन प्रक्रिया: खरिदको लागि दररेट माग प्रक्रिया

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: २२६६२०६

प्रभावकारिता: खोला कटान नियन्त्रण भई जग्गा जमिन संरक्षण

लाभान्वित घरधुरी: १००

रोजगारी श्रृजना: ३५० श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार १ वर्ष सम्म सम्बन्धित फर्म स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: श्री अवि कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि., रामपुर ०५, पाल्पा

संचालकको नाम: अभिनास रेग्मी

साइट इन्चार्ज: बालकृष्ण कार्की (ईन्जिनियर)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: ज्यादी पर्यावरण संरक्षण पार्क निर्माण, रामपुर ६, र हरियाली पार्क निर्माण, बड्शगोपाल मन्दिर परिसर, तानसेन नगरपालिका ७, प्रभास, पाल्पा

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.८८२७४८ देशान्तर: ८३.८७६९१४

अक्षांश: २७.८४०७३८ देशान्तर: ८३.५४१८३६

उद्देश्य: पार्क संरक्षण र मन्दिर परिसर संरक्षण

निर्माण गरिएको संरचना: ढुङ्गा छान्ने कार्य (१५८.५*१.९१) मि मा ३०२.७४ बर्म मि क्षेत्रफल,

३१२ घ.मि. माटो खन्ने कार्य, ६० घ.मि. को ग्याबियन, ६३ ब.मि.मा ढुङ्गा छपान, ४८८ कि.ग्रा.को फलामकाम, १८ घ.मि. मेसन, २०.५६ घ.मि. कन्क्रिट, प्लास्टर तथा रँगरोगन कार्य

कार्यान्वयन प्रक्रिया: खरिदको लागि दररेट माग प्रक्रिया

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: २२३३५९५

प्रभावकारिता: खोला कटान नियन्त्रण भई जग्गा जमिन संरक्षण

लाभान्वित घरधुरी: पर्यटकहरु

रोजगारी श्रृजना: ३७० श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार १ वर्ष सम्म सम्बन्धित फर्म स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: श्री अवि कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि., रामपुर ०५, पाल्पा

संचालकको नाम: अभिनास रेग्मी

साइट इन्चार्ज: बालकृष्ण कार्की (ईन्जिनियर)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



संरक्षण पार्श्वचित्र २०८२/०८३

कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार ब्यबस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: तिनाउखोला तटबन्धन तथा संरक्षण योजना, मथागढी गा. पा. ३ पाल्पा

स्थान: मथागढी गा. पा. ३, पाल्पा

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.८२१९१३ देशान्तर: ८३.५९८९२६

उद्देश्य: भू क्षय नियन्त्रण गर्नुका साथै खोलाले गर्दा जोखिममा रहेको जग्गा जमिनको संरक्षण

निर्माण गरिएको संरचना: १६ मिटर तारजालीमा ढुंगा भरी तटबन्धन निर्माण (४९.८३ घ.मि.)

कार्यान्वयन प्रक्रिया: खरिदको लागि दररेट माग

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: ३,६६,३४६/९६

प्रभावकारिता: जमिन कटान रोकथाम तथा कृषि योग्य जमिनको संरक्षण

लाभान्वित घरधुरी: ३७

रोजगारी श्रृजना: ७४ श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार १ वर्ष सम्म सम्बन्धित फर्म स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: यश कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा. लि.

संचालकको नाम: खोम बहादुर लांग्वाली

साइट इन्चार्ज: सुमित बस्नेत (सब - इन्जिनियर)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार ब्यबस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: सत्यवती ताल संरक्षण, तिनाउ गा. पा. ४, पाल्पा

स्थान: तिनाउ गा. पा. ४, पाल्पा

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.७५५६२९ देशान्तर: ८३.५४१६२६

उद्देश्य: खानेपानीको ब्यबस्था भएको खण्डमा पर्यटकहरुलाई सुबिधा

निर्माण गरिएको संरचना: फेरो सिमेन्ट टंकी निर्माण (२० घ.मि.)

कार्यान्वयन प्रक्रिया: खरिदको लागि दररेट माग

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: ३,७८,००९/९३

प्रभावकारिता: खानेपानीको ब्यबस्थापनमा टेवा पुग्ने

लाभान्वित घरधुरी: २६

रोजगारी श्रृजना: ८६ श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार १ वर्ष सम्म सम्बन्धित फर्म स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: गोक्यो इन्जिनियरिंग एण्ड कन्स्ट्रक्सन प्रा. लि.

संचालकको नाम: शान्ता नेपाल

साइट इन्चार्ज: सुमित बस्नेत (सब - इन्जिनियर)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार ब्यबस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: लेकको सामुदायिक वनमा पोखरी निर्माण, रिब्दिकोट गा. पा. २, पाल्पा

स्थान: रिब्दिकोट गा. पा. २, पाल्पा

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.८९७०७९ देशान्तर: ८३.४४७२४४

उद्देश्य: आकाशे तथा भलपानी संकलन गर्नुका साथै जमिनमूनि जल पुनर्भरण गरी भूमिगत पानीको सतह वृद्धि गर्न निर्माण गरिएको संरचना: पक्कि पर्खाल सहितको पोखरी निर्माण (१८.९ घ.मि.)

कार्यान्वयन प्रक्रिया: खरिदको लागि दररेट माग

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: ३,८१,९६१.८६

प्रभावकारिता: आकाशे तथा भलपानी संकलन भई जमिनमूनि जल पुनर्भरण र भूमिगत पानीको सतह वृद्धिमा टेवा पुगेको
लाभान्वित घरधुरी: २४ **रोजगारी श्रृजना:** ६४ श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार १ वर्ष सम्म सम्बन्धित फर्म स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: सुरेन्द्र निर्माण सेवा

संचालकको नाम: सुरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ

साइट इन्चार्ज: सुमित बस्नेत (सब - इन्जिनियर)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार ब्यबस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: हार्थोक बजार पहिरो नियन्त्रण , रिब्दिकोट गा. पा. ३, पाल्पा

स्थान: रिब्दिकोट गा. पा. ३, पाल्पा

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.८७२८३ देशान्तर: ८३.४६५९३९

उद्देश्य: हार्थोक बजार तथा सडक संरक्षणको लागि पहिरो नियन्त्रण गर्ने

निर्माण गरिएको संरचना: १३.१० मिटर पक्कि छेक पर्खाल निर्माण (३९.३ घ.मि.)

कार्यान्वयन प्रक्रिया: खरिदको लागि दररेट माग

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: रु.६,६१,२७९/००

प्रभावकारिता: पक्कि छेक पर्खाल निर्माणले पहिरो रोकथाममा टेवा पुगेको

लाभान्वित घरधुरी: १८

रोजगारी श्रृजना: १४८ श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार १ वर्ष सम्म सम्बन्धित फर्म स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी

कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: आर. ए. निर्माण सेवा, बाणागंगा ६, कपिलवस्तु

संचालकको नाम: माधव प्रसाद खनाल

साइट इन्चार्ज: सुमित बस्नेत (सब - इन्जिनियर)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार ब्यबस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: तानसिने चुहारे खोला पक्की पुल नजिक खेत तथा बस्ति संरक्षण तटबन्धन, बगनासकाली १ पाल्पा

स्थान: बगनासकाली १, पाल्पा

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.८३६०४९ देशान्तर: ८३.५७९९९४

उद्देश्य: भू क्षय नियन्त्रण गर्नुका साथै खोलाले गर्दा जोखिममा रहेको जग्गा जमिनको संरक्षण

निर्माण गरिएको संरचना: २३ मिटर तारजालीमा ढुंगा भरी तटबन्धन निर्माण (६८.५१ घ.मि.)

कार्यान्वयन प्रक्रिया: खरिदको लागि दररेट माग

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: ५,३४,९८७/३१

प्रभावकारिता: जमिन कटान रोकथाम तथा कृषि योग्य जमिनको संरक्षण

लाभान्वित घरधुरी: २६

रोजगारी श्रृजना: १०४ श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार १ वर्ष सम्म सम्बन्धित फर्म स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: यस कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा. लि.

संचालकको नाम: खोम बहादुर लांघाली

साइट इन्चार्ज: सुमित बस्नेत (सब - इन्जिनियर)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार ब्यबस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: बजादी बस्ती माथीको पहिरो तटबन्धन, रैनाछहरा गा. पा. २ पाल्पा

स्थान: , रैनाछहरा गा. पा. २ पाल्पा

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.९०६८२८ देशान्तर: ८३.३९२८८५

उद्देश्य: बजादी बस्ती माथीको पहिरो नियन्त्रण र ग्रामिण सडक संरक्षण गर्ने

निर्माण गरिएको संरचना: २४ मिटर पक्कि छेक पर्खाल निर्माण (११० घ.मि.)

कार्यान्वयन प्रक्रिया: खरिदको लागि दररेट माग

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: रु.७,६१,४८४/४०

प्रभावकारिता: ग्याबिन छेक पर्खाल निर्माणले पहिरो रोकथाम र ग्रामिण सडक संरक्षणमा टेवा पुगेको

लाभान्वित घरधुरी: २२

रोजगारी श्रृजना: ९० श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार १ वर्ष सम्म सम्बन्धित फर्म स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: सुजल कन्स्ट्रक्सन कन्सल्टेन्सी एण्ड सप्लायर्स प्रा. लि.

संचालकको नाम: माधव पौडेल

साइट इन्चार्ज: सुमित बस्नेत (सब - इन्जिनियर)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार ब्यबस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: कालिगण्डकी तटबन्ध निर्माण तानसेन १४ पाल्पा

स्थान: तानसेन १४, पाल्पा

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.६९९९३९ देशान्तर: ८३.३९७२७५

उद्देश्य: भू क्षय नियन्त्रण गर्नुका साथै खोलाको गर्दा जोखिममा रहेको जग्गा जमिन तथा पुलको संरक्षण

निर्माण गरिएको संरचना: २४ मिटर तारजालीमा ढुंगा भरी तटबन्धन निर्माण (१६६ घ.मि.)

कार्यान्वयन प्रक्रिया: बोलपत्र खरिद,

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: ७,९१,२७६/८०

प्रभावकारिता: जमिन कटान रोकथाम तथा सडक तथा पुलको संरक्षण

लाभान्वित घरधुरी: २९

रोजगारी श्रृजना: १३६ श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार १ वर्ष सम्म सम्बन्धित फर्म स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: स्वोर्गद्वारी कन्स्ट्रक्सन

संचालकको नाम: भुवन भट्टराई

साइट इन्चार्ज: सुमित बस्नेत (सब - इन्जिनियर)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार ब्यबस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: लुम्बिनी मा.वि पछाडी पहिरो नियन्त्रण, तानसेन न.पा १२ बौधापोखराथोक, पाल्पा

स्थान: तानसेन न.पा १२, बौधापोखराथोक, पाल्पा

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.९०५३४१ देशान्तर: ८३.४८५७८६

उद्देश्य: भू क्षय नियन्त्रण गर्नुका साथै विद्यालय परिषरको जग्गा जमिनको संरक्षण

निर्माण गरिएको संरचना: ४४ मिटर तारजालीमा ढुंगा भरी तटबन्धन निर्माण (३२७.४९ घ.मि.)

कार्यान्वयन प्रक्रिया: बोलपत्र खरिद

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: १९,९५,७८२.९२

प्रभावकारिता: भू क्षय नियन्त्रण

लाभान्वित घरधुरी: २५

रोजगारी श्रृजना: २५८ श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार १ वर्ष सम्म सम्बन्धित फर्म स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: रनुवा कन्स्ट्रक्सन प्रा. लि.

संचालकको नाम: कपिल पाण्डे

साइट इन्चार्ज: सुमित बस्नेत (सब - इन्जिनियर)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: जलाधार संरक्षण तथा सिमसार ब्यबस्थापन कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)

क्रियाकलापको नाम: रिडी खोला नियन्त्रण तथा तटबन्ध तानसेन न पा १४ अर्गेली कुसेनी पाल्पा

स्थान: तानसेन न. पा. १४ अर्गेली, कुसेनी, पाल्पा

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.९३९७९२ देशान्तर: ८३.४३१०६८

उद्देश्य: नदि किनार ब्यबस्थापन गर्नुका साथै जग्गा जमिनको संरक्षण

निर्माण गरिएको संरचना: ६२ मिटर तारजालीमा ढुंगा भरी तटबन्धन निर्माण (३३२.८८ घ.मि.)

कार्यान्वयन प्रक्रिया: बोलपत्र खरिद प्रक्रिया

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: १५,६१,७४०.२६

प्रभावकारिता: नदि किनार ब्यबस्थापन गर्नुका साथै जग्गा जमिनको संरक्षणमा टेवा पुग्ने

लाभान्वित घरधुरी: १२

रोजगारी श्रृजना: ५२७ श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार १ वर्ष सम्म सम्बन्धित फर्म स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: स्वर्णद्वारी कन्स्ट्रक्सन

संचालकको नाम: भुवन भट्टराई

साइट इन्चार्ज: सुमित बस्नेत (सब - इन्जिनियर)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: निस्दीखोला सेरा छरछरे तटबन्धन निर्माण

स्थान: रामपुर न. पा. २, पाल्पा

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.८५८५२०८ देशान्तर: ८३.९३९६३३१

उद्देश्य: खोला कटान नियन्त्रण गर्नुका साथै कटानले गर्दा जोखिममा रहेको जग्गा जमिन संरक्षण

निर्माण गरिएको संरचना: २ तह ४४ घ.मि. को २२ मिटर ग्याबियन ग्याबियन तटबन्ध निर्माण

कार्यान्वयन प्रक्रिया: स्थानीय उपभोक्ता समिति मार्फत जनसहभागितामा ।

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: १९४०० **उपभोक्ताले बेहोर्ने रकम:** २३११७६

प्रभावकारिता: खोला कटान नियन्त्रण भई जग्गा जमिनको संरक्षण

लाभान्वित घरधुरी: १२

रोजगारी श्रृजना: ३५ श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार उपभोक्ता स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

उपभोक्ता समितिको नाम: श्री शेरा छरछरे कृषक समूह खेत संरक्षण

अध्यक्षको नाम: मुना अधिकारी

साइट इन्चार्ज: बालकृष्ण कार्की (इन्जिनियर)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: झिरुबास पानीघाट पहिरो संरक्षण

स्थान: निस्दी गा. पा. ३, पाल्पा

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.७८३८६७६ देशान्तर: ८३.९५४१०८२

उद्देश्य: खोला बाट सृजित भएको पहिरो नियन्त्रण गरि बाटो र जग्गा संरक्षण गर्न ।

निर्माण गरिएको संरचना: (१४*०.८*२)मि २.४ घ.मि. टेवा पर्खाल निर्माण निर्माण

कार्यान्वयन प्रक्रिया: स्थानीय उपभोक्ता समिति मार्फत जनसहभागितामा ।

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: १९४००

उपभोक्ताले बेहोर्ने रकम: २२८३३

प्रभावकारिता: बाटो र जमिनको संरक्षण

लाभान्वित घरधुरी: १२

रोजगारी श्रृजना: २७ श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार उपभोक्ता स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

उपभोक्ता समितिको नाम: श्री निस्दी झिरुबास पहिरो नियन्त्रण उपभोक्ता समिति

अध्यक्षको नाम: नेत्र बहादुर सोती

साइट इन्चार्ज: बालकृष्ण कार्की (ईन्जिनियर)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. ३५ गुल्म हेड क्वार्टरको पहिरो नियन्त्रण

स्थान: तानसेन न.पा. ०६, धुर्वघाट, पाल्पा

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.८६९५१६ देशान्तर: ८३.५६३०८९

उद्देश्य: पहिरोको जोखिममा रहेको भवन र जग्गा जमिनको संरक्षण

निर्माण गरिएको संरचना: (३०*१*२) मिटर ६० घ.मि. ग्याबिन टेवा पर्खाल निर्माण

कार्यान्वयन प्रक्रिया: खरिदको लागि दररेट माग

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: ५७९१४७

प्रभावकारिता: भवन र जग्गा जमिनको पहिरोबाट संरक्षित

लाभान्वित घरधुरी: सशस्त्र प्रहरी बल परिवार

रोजगारी श्रृजना: ६६ श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार १ वर्ष सम्म सम्बन्धित फर्म स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: श्री एम एक्स कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि., तानसेन ०९, पाल्पा

संचालकको नाम: माधब श्रेष्ठ

साइट इन्चार्ज: बालकृष्ण कार्की (इन्जिनियर)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: अगाहखोला तटबन्ध निर्माण

स्थान: रम्भा गा. पा. ४, पाल्पा

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.८४३५६०५ देशान्तर: ८३.६९४२३१२

उद्देश्य: खोला कटान नियन्त्रण गर्नुका साथै कटानले गर्दा जोखिममा रहेको जग्गा जमिन संरक्षण

निर्माण गरिएको संरचना: (३३*१.५*२) मिटर ८९.५ घ.मि. ग्याबिन टेवा पर्खाल निर्माण

कार्यान्वयन प्रक्रिया: स्थानीय उपभोक्ता समिति मार्फत जनसहभागितामा ।

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: ५८२००० **उपभोक्ताले बेहोर्ने रकम:** ६४६६८

प्रभावकारिता: खोला कटान नियन्त्रण भई जग्गा जमिनको संरक्षण

लाभान्वित घरधुरी: १४

रोजगारी श्रृजना: ७४ श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार उपभोक्ता स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

उपभोक्ता समितिको नाम: श्री अगाहाखोला तटबन्ध निर्माण उपभोक्ता समिति

अध्यक्षको नाम: कमल राज न्यौपाने

साइट इन्चार्ज: बालकृष्ण कार्की (इन्जिनियर)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: भट्टराई कुल मन्दिर तथा राम बगैचा चापखोला खलैचे बाटो तथा बस्ती संरक्षण

स्थान: बगनासकाली गा.पा. ७, पाल्पा

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.९०७२७९७ देशान्तर: ८३.५५५९६५९

उद्देश्य: पहिरोबाट कुलो संरक्षण

निर्माण गरिएको संरचना: (१५*२*१) मिटर ३० घ.मि. ग्याबिन टेवा पर्खाल निर्माण

कार्यान्वयन प्रक्रिया: स्थानीय उपभोक्ता समिति मार्फत जनसहभागितामा ।

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: १९४००

उपभोक्ताले बेहोर्ने रकम: २२८३३

प्रभावकारिता: कुलो संरक्षण

लाभान्वित घरधुरी: १३

रोजगारी श्रृजना: २७ श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार उपभोक्ता स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

उपभोक्ता समितिको नाम: श्री भट्टराई कुल मन्दिर तथा राम बगैँचा चापखोला अलैचे मो.बा. संरक्षण एवं मर्मत समिति

अध्यक्षको नाम: डोलराज भट्टराई

साइट इन्चार्ज: बालकृष्ण कार्की (इन्जिनियर)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: रजवइ खोला तटबन्ध निर्माण

स्थान: रिब्दिकोट गा. पा. ४ र ६, पाल्पा

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.८२२०५०१

देशान्तर: ८३. ४७८७९५१

उद्देश्य: खोला किनार संरक्षण गरि खेत बारी संरक्षण

निर्माण गरिएको संरचना: (७०*१.५*१) मिटर १०५ घ.मि. ग्याबिन टेवा पर्खाल निर्माण

कार्यान्वयन प्रक्रिया: स्थानीय उपभोक्ता समिति मार्फत जनसहभागितामा ।

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: २९१०००

उपभोक्ताले बेहोर्ने रकम: ३४८३९

प्रभावकारिता: खेत बारी संरक्षण

लाभान्वित घरधुरी: ११

रोजगारी श्रृजना: ८५ श्रमदिन


मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार उपभोक्ता स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

उपभोक्ता समितिको नाम: श्री रजबै तटबन्ध निर्माण उपभोक्ता समिति

अध्यक्षको नाम: अनिता साकी

साइट इन्चार्ज: बालकृष्ण कार्की (इन्जिनियर)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:

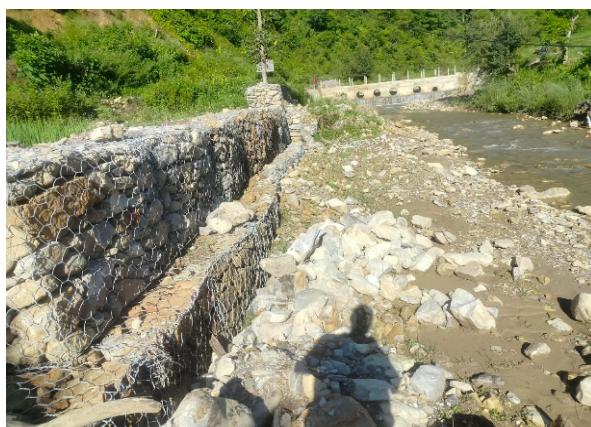

कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: पुजेरी पिपल पहारे आँप अमराई कृषि सडक पहिरो नियन्त्रण

स्थान: बगनासकाली गा.पा. २, पाल्पा

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.८४५५४९९

देशान्तर: ८३.६०२०५११

उद्देश्य: पहिरोको जोखिममा रहेको बाटो संरक्षण

निर्माण गरिएको संरचना: (१००*२*२) मिटर ४१२ घ.मि. ग्याबिन टेवा पर्खाल निर्माण

कार्यान्वयन प्रक्रिया: स्थानीय उपभोक्ता समिति मार्फत जनसहभागितामा ।

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: १९४००

उपभोक्ताले बेहोर्ने रकम: २१८५८

प्रभावकारिता: पहिरोको जोखिममा रहेको बाटो संरक्षण

लाभान्वित घरधुरी: २२

रोजगारी श्रृजना: २९० श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार उपभोक्ता स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

उपभोक्ता समितिको नाम: श्री पहारे आप पहिरो नियन्त्रण उपभोक्ता समिति

अध्यक्षको नाम: लक्ष्मी पहारी

साइट इन्चार्ज: बालकृष्ण कार्की (ईन्जिनियर)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: जाम्दि कोटथर खानेपानी पहिरो नियन्त्रण

स्थान: पूर्वखोला १ सिलुवा, माथिल्लोकोट, पाल्पा

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.८३५७९५ देशान्तर: ८३.८५२१४६

उद्देश्य: पहिरोको जोखिममा पानी मुहान र ट्याङ्की संरक्षण

निर्माण गरिएको संरचना: (२०*१.५*३) मिटर ७५ घ.मि. ग्याबिन टेवा पर्खाल निर्माण

कार्यान्वयन प्रक्रिया: स्थानीय उपभोक्ता समिति मार्फत जनसहभागितामा ।

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: ३८२१२०

उपभोक्ताले बेहोर्ने रकम: ४३९६३

प्रभावकारिता: पहिरोको जोखिममा पानी मुहान र ट्याङ्की संरक्षण

लाभान्वित घरधुरी: ९५

रोजगारी श्रृजना: ३३० श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार उपभोक्ता स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

उपभोक्ता समितिको नाम: जाम्दी कोटथर खानेपानी तथा सरसफाई योजना उपभोक्ता समिति, पूर्वखोला १, सिलुवा

अध्यक्षको नाम: ज्ञानेन्द्र पुलामी

साइट इन्चार्ज: सन्दीप चौधरी (व.भू.सं.अ)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: हाङ्गदी खोला मुल संरक्षण

स्थान: तानसेन न. पा. ६, पाल्पा

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.४६४१११३

देशान्तर: ८३.५५४६६१६१

उद्देश्य: पहिरो नियन्त्रण

निर्माण गरिएको संरचना: ढुङ्गा र मेसिनरी वाल निर्माण १८ घ.मि.

कार्यान्वयन प्रक्रिया: स्थानीय उपभोक्ता समिति मार्फत जनसहभागितामा ।

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: १९४००

उपभोक्ताले बेहोर्ने रकम: २१७४०

प्रभावकारिता: पहिरोको जोखिममा रहेको बाटो संरक्षण

लाभान्वित घरधुरी: १४

रोजगारी श्रृजना: ५२ श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार उपभोक्ता स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

उपभोक्ता समितिको नाम: श्री पानीटंकी टोल मूल संरक्षण योजना, तानसेन ०६, पाल्पा

अध्यक्षको नाम: राम बहादुर बिष्ट

साइट इन्चार्ज: बालकृष्ण कार्की (ईन्जिनियर)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



३.२ रुपन्देही जिल्लामा संचालित कार्यक्रमहरुको पार्श्वचित्र

कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: सार्वजनिक पोखरी संरक्षण तथा व्यवस्थापन

स्थान: सियारी गा. पा. २, मैनाहिया, रुपन्देही

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.५३८७१६ देशान्तर: ८३.३९५०९३

उद्देश्य: आकाशे तथा भलपानी संकलन गर्नुका साथै जमिनमूनि जल पुनर्भरण गरी भूमिगत पानीको सतह वृद्धि गर्न

निर्माण गरिएको संरचना: रिचार्ज पोखरी (पोखरी डिल मर्मत)

कार्यान्वयन प्रक्रिया: खरिदको लागि दररेट माग

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: १५४०४१

प्रभावकारिता: १४०० घ.मि. आकाशे तथा भलपानी संकलन भई जमिनमूनि जल पुनर्भरण र भूमिगत पानीको सतह वृद्धिमा टेवा पुगेको

लाभान्वित घरधुरी: ५०

रोजगारी श्रृजना: ५ श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार १ वर्ष सम्म सम्बन्धित फर्म स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: जेसिका निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि., सरावल १, नवलपरासी

संचालकको नाम: किशोर कुमार चौधरी

साइट इन्चार्ज: सन्दीप चौधरी (व.भू.सं.अ)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: कोटिहवा थारु गाउँको ऐतिहासिक पोखरी व्यवस्थापन

स्थान: तिलोत्तमा न.पा. १५, रुपन्देही

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.५६९६९५ देशान्तर: ८३.४६५५९२

उद्देश्य: ऐतिहासिक पोखरीमा आकाशे तथा भलपानी संकलन गर्नुका साथै जमिनमूनि जल पुनर्भरण गरी भूमिगत पानीको सतह वृद्धि गर्न

निर्माण गरिएको संरचना: रिचार्ज पोखरी (पोखरी डिल मर्मत)

कार्यान्वयन प्रक्रिया: खरिदको लागि दररेट माग

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: २४११७५

प्रभावकारिता: १८०० घ.मि. आकाशे तथा भलपानी संकलन भई जमिनमूनि जल पुनर्भरण र भूमिगत पानीको सतह वृद्धिमा टेवा पुगेको

लाभान्वित घरधुरी: २३

रोजगारी श्रृजना: ३६ श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार १ वर्ष सम्म सम्बन्धित फर्म स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: श्री अस्टचिरिन्जीवी विल्डर्स एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि., नवलपरासी

संचालकको नाम: गोपाल प्रसाद घिमिरे

साइट इन्चार्ज: बालकृष्ण कार्की (ईन्जिनियर)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: रिचार्ज पोखरी निर्माण, पहिला खोला सामुदायिक बन सैनामैना १० र ११ (रुपन्देही)

स्थान: सैनामैना १०, रुपन्देही

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.७२०३७१ देशान्तर: ८३.२६२४५९

उद्देश्य: आकाशे तथा भलपानी संकलन गर्नुका साथै जमिनमूनि जल पुनर्भरण गरी भूमिगत पानीको सतह वृद्धि गर्न निर्माण गरिएको **संरचना:** रिचार्ज पोखरी (३५*३०*१.२१) मिटर, १२७० घ.मि.

कार्यान्वयन प्रक्रिया: उपभोक्ता समिति

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: २३२८००

उपभोक्ताको तर्फबाट रु: २६३२३

प्रभावकारिता: आकाशे तथा भलपानी संकलन भई जमिनमूनि जल पुनर्भरण र भूमिगत पानीको सतह वृद्धिमा टेवा पुगेको **लाभान्वित घरधुरी:** ४७

रोजगारी श्रृजना: ६७ श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार उपभोक्ता स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

उपभोक्ता समितिको नाम: रिचार्ज पोखरी निर्माण उपभोक्ता समिति, सैनामैना, रुपन्देही

अध्यक्षको नाम: छबिकला अर्याल

साइट इन्चार्ज: बालकृष्ण कार्की (इन्जिनियर)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: सुकौली खोलाको शिरमा भालु खोलामा रिचार्ज पोखरी निर्माण सैनामैना न.पा. २ रुपन्देही

स्थान: सैनामैना न.पा. २, रुपन्देही

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.६९८२५९ देशान्तर: ८३.३६६८४९

उद्देश्य: आकाशे तथा भलपानी संकलन गर्नुका साथै जमिनमूनि जल पुनर्भरण गरी भूमिगत पानीको सतह वृद्धि तथा तटबन्ध निर्माण

निर्माण गरिएको संरचना: रिचार्ज पोखरी (२०*१४.४५*१.५) मिटर, ४२२.४८ घ.मि. र २१ घ.मि. ग्याबियन तटबन्ध

कार्यान्वयन प्रक्रिया: खरिदको लागि दररेट माग

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: २३२८००

उपभोक्ताको तर्फबाट रु: २६३२३

प्रभावकारिता: आकाशे तथा भलपानी संकलन भई जमिनमूनि जल पुनर्भरण र भूमिगत पानीको सतह वृद्धिमा टेवा पुगेको
लाभान्वित घरधुरी: ३६

रोजगारी श्रृजना: ४५ श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार उ.स. स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५% धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: श्री जे.एस.के. निर्माण सेवा प्रा.लि.

संचालकको नाम: सुशील बस्याल

साइट इन्चार्ज: बालकृष्ण कार्की (ईन्जिनियर)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: रिचार्ज पोखरी निर्माण, बरपानी सामुदायिक बन सैनामैना -९ (रुपन्देही)

स्थान: सैनामैना -९, रुपन्देही

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.७०१९२१ देशान्तर: ८३.२२८७६१२

उद्देश्य: आकाशे तथा भलपानी संकलन गर्नुका साथै जमिनमूनि जल पुनर्भरण गरी भूमिगत पानीको सतह वृद्धि तथा तटबन्ध निर्माण

निर्माण गरिएको संरचना: रिचार्ज पोखरी (४५*४५*०.७८) मिटर, १५७९.५ घ.मि. र १७.५ घ.मि. ग्याबियन तटबन्ध

कार्यान्वयन प्रक्रिया: खरिदको लागि दररेट माग

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: २३१६४८ उपभोक्ताको तर्फबाट रु: २६३२३

प्रभावकारिता: आकाशे तथा भलपानी संकलन भई जमिनमूनि जल पुनर्भरण र भूमिगत पानीको सतह वृद्धिमा टेवा पुगेको
लाभान्वित घरधुरी: २८ **रोजगारी श्रृजना:** ३१ श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार १ वर्ष सम्म सम्बन्धित फर्म स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: पन्थ कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.

संचालकको नाम: सुमन पन्थ

साइट इन्चार्ज: बालकृष्ण कार्की (ईन्जिनियर)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: मिलन पार्कमा पोखरी निर्माण तथा सतगढी २ खोला तटबन्धन बुटवल उपमन.पा. १२ रुपन्देही

स्थान: बुटवल उ.म.न.पा. १२, रुपन्देही

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.६९२१९७ देशान्तर: ८३.४११९४१

उद्देश्य: खोला कटान नियन्त्रण गर्नुका साथै कटानले गर्दा जोखिममा रहेको जग्गा जमिन संरक्षण

निर्माण गरिएको संरचना: २ तह ७७.७५ घ.मि. को २२ मिटर ग्याबियन ग्याबियन तटबन्ध निर्माण

कार्यान्वयन प्रक्रिया: खरिदको लागि दररेट माग प्रक्रिया

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: ४६०९१२

प्रभावकारिता: खोला कटान नियन्त्रण भई जग्गा जमिनको संरक्षण

लाभान्वित घरधुरी: ५०

रोजगारी श्रृजना: ४० श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार १ वर्ष सम्म सम्बन्धित फर्म स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: बि एम पि कस्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि., गढवा १, दाङ

संचालकको नाम: बिर बहादुर पुन

साइट इन्चार्ज: सन्दीप चौधरी (व.भू.सं.अ)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार ब्यबस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: दानापुर पहिला नदि तटबन्धन कन्चन ०१, रुपन्देही

स्थान: कन्चन ०१, रुपन्देही

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.६६९९१ देशान्तर: ८३.२६७९५१

उद्देश्य: भू क्षय नियन्त्रण गर्नुका साथै खोलाले गर्दा जोखिममा रहेको जग्गा जमिनको संरक्षण

निर्माण गरिएको संरचना: १८ मिटर तारजालीमा ढुंगा भरी तटबन्धन निर्माण (९४.५० घ.मि.)

कार्यान्वयन प्रक्रिया: खरिदको लागि दररेट माग

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: ६,६६,८४६.९०

प्रभावकारिता: जमिन कटान रोकथाम तथा कृषि योग्य जमिनको संरक्षण

लाभान्वित घरधुरी: २०

रोजगारी श्रृजना: ७५ श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार १ वर्ष सम्म सम्बन्धित फर्म स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी

कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: बल्याक टावर ग्रुप अफ कन्स्ट्रक्सन प्रा. लि., रोहिणी ४, रुपन्देही

संचालकको नाम: ब्रिजमान धोबी

साइट इन्चार्ज: सुमित बस्नेत (सब - इन्जिनियर)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार ब्यबस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: कञ्चन नदि तटबन्ध, सैनामैना १० र ११ (रुपन्देहि)

स्थान: सैनामैना १०, रुपन्देहि

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.६७८२३६ देशान्तर: ८३.२६३९६९

उद्देश्य: भू क्षय नियन्त्रण गर्नुका साथै खोलाले गर्दा जोखिममा रहेको जग्गा जमिनको संरक्षण

निर्माण गरिएको संरचना: १८ मिटर तारजालीमा ढुंगा भरी तटबन्धन निर्माण (९४.५० घ.मि.)

कार्यान्वयन प्रक्रिया: खरिदको लागि दररेट माग

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: ६,६३,१३९.९४

प्रभावकारिता: जमिन कटान रोकथाम तथा कृषि योग्य जमिनको संरक्षण

लाभान्वित घरधुरी: २७

रोजगारी श्रृजना: ७२ श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार १ वर्ष सम्म सम्बन्धित फर्म स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी

कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: आदित्य निर्माण सेवा, ओमसतिया ३, रुपन्देही

संचालकको नाम: सागर यादव

साइट इन्चार्ज: सुमित बस्नेत (सब - इन्जिनियर)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार ब्यबस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: चारपाला सामुदायिक वनक्षेत्रमा तटबन्धन, बुटवल उपमन.पा. १२ रुपन्देही

स्थान: बुटवल उ.म.न.पा. १२, रुपन्देही

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.६९९९३९ देशान्तर: ८३.३९७२७५

उद्देश्य: भू क्षय नियन्त्रण गर्नुका साथै खोलाले गर्दा जोखिममा रहेको जग्गा जमिनको संरक्षण

निर्माण गरिएको संरचना: २१ मिटर तारजालीमा ढुंगा भरी तटबन्धन निर्माण (११०.२५ घ.मि.)

कार्यान्वयन प्रक्रिया: खरिदको लागि दररेट माग

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: ७,६४,७४०/९७

प्रभावकारिता: जमिन कटान रोकथाम तथा कृषि योग्य जमिनको संरक्षण

लाभान्वित घरधुरी: १७

रोजगारी श्रृजना: १२८ श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार १ वर्ष सम्म सम्बन्धित फर्म स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी

कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: श्री राम निर्माण सेवा, बाणगंगा ७, कपिलवस्तु

संचालकको नाम: सागर यादव

साइट इन्चार्ज: सुमित बस्नेत (सब - इन्जिनियर)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: सतियामाई मन्दिर अगाडी रोहीणी नदीमा तटबन्धन

स्थान: ओमसतिया गा. पा. ५, रुपन्देही

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.५२४९४७ देशान्तर: ८३.५०७८३

उद्देश्य: खोला कटान नियन्त्रण गर्नुका साथै कटानले गर्दा जोखिममा रहेको जग्गा जमिन संरक्षण

निर्माण गरिएको संरचना: २ तह ७२.७५ घ.मि. को २४ मिटर ग्याबियन ग्याबियन तटबन्ध निर्माण

कार्यान्वयन प्रक्रिया: खरिदको लागि दररेट माग प्रक्रिया

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: ४६१३१४

प्रभावकारिता: खोला कटान नियन्त्रण भई जग्गा जमिनको संरक्षण

लाभान्वित घरधुरी: १०

रोजगारी श्रृजना: ५५ श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार १ वर्ष सम्म सम्बन्धित फर्म स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी

कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: श्री सम्राट कन्स्ट्रक्सन रुपन्देही

संचालकको नाम: यंजय प्रसाद बेलबासे

साइट इन्चार्ज: बालकृष्ण कार्की (ईन्जिनियर)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: सिलौटिया मन्दिर निर रोहणी खोलामा तटबन्धन

स्थान: ओमसतिया गा. पा. ५, रुपन्देही

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.५२४२९२ देशान्तर: ८३.५०७७५२

उद्देश्य: खोला कटान नियन्त्रण गर्नुका साथै कटानले गर्दा जोखिममा रहेको जग्गा जमिन संरक्षण

निर्माण गरिएको संरचना: २ तह ८५.५ घ.मि. को २४ मिटर ग्याबियन ग्याबियन तटबन्ध निर्माण

कार्यान्वयन प्रक्रिया: खरिदको लागि दररेट माग प्रक्रिया

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: ५३९१९९

प्रभावकारिता: खोला कटान नियन्त्रण भई जग्गा जमिनको संरक्षण

लाभान्वित घरधुरी: २०

रोजगारी श्रृजना: ७० श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार १ वर्ष सम्म सम्बन्धित फर्म स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी

कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: श्री सैनामैना कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि., रुपन्देही

संचालकको नाम: यंजय प्रसाद बेलबासे

साइट इन्चार्ज: बालकृष्ण कार्की (ईन्जिनियर)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: डण्डा पुल नजिक रहेको हनुमान मन्दिरको किनारमा डण्डा नदिमा तटबन्धन निर्माण

स्थान: ओमसतिया गा. पा. ४, रुपन्देही

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.५०५०२ देशान्तर: ८३.४६६५७६

उद्देश्य: खोला कटान नियन्त्रण गर्नुका साथै कटानले गर्दा जोखिममा रहेको जग्गा जमिन र मन्दिर परिसर संरक्षण

निर्माण गरिएको संरचना: २ तह ६१.५ घ.मि. को २१ मिटर ग्याबियन ग्याबियन तटबन्धन निर्माण

कार्यान्वयन प्रक्रिया: खरिदको लागि दररेट माग प्रक्रिया

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: ४८४८६०

प्रभावकारिता: खोला कटान नियन्त्रण भई जग्गा जमिन तथा मन्दिर परिसर संरक्षण

लाभान्वित घरधुरी: मन्दिर परिवार

रोजगारी श्रृजना: ४६ श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार १ वर्ष सम्म सम्बन्धित फर्म स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी

कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: श्री श्री स्टार निर्माण सेवा

संचालकको नाम: प्रकाश यादव

साइट इन्चार्ज: बालकृष्ण कार्की (ईन्जिनियर)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: कजरार नदि नियन्त्रण तथा तटबन्धन

स्थान: देवदह नगरपालिका, रुपन्देही

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.६३८३५ देशान्तर: ८३.५९९०८४

उद्देश्य: खोला कटान नियन्त्रण गर्नुका साथै कटानले गर्दा जोखिममा रहेको जग्गा जमिन संरक्षण

निर्माण गरिएको संरचना: २ तह ६१.२५ घ.मि. को २१ मिटर ग्याबियन ग्याबियन तटबन्ध निर्माण

कार्यान्वयन प्रक्रिया: खरिदको लागि दररेट माग प्रक्रिया

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: ३८४५६९

प्रभावकारिता: खोला कटान नियन्त्रण भई जग्गा जमिन संरक्षण

लाभान्वित घरधुरी: ३०

रोजगारी श्रृजना: ५५ श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार १ वर्ष सम्म सम्बन्धित फर्म स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी

कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: श्री श्री स्टार निर्माण सेवा

संचालकको नाम: प्रकाश यादव

साइट इन्चार्ज: बालकृष्ण कार्की (इन्जिनियर)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: टटेरा थारु गाउँ रोहणी नदिमा तटबन्धन

स्थान: देवदह न.पा. ३, रुपन्देही

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.६२४८११ देशान्तर: ८३.५४६२८३

उद्देश्य: खोला कटान नियन्त्रण गर्नुका साथै कटानले गर्दा जोखिममा रहेको जग्गा जमिन संरक्षण

निर्माण गरिएको संरचना: २ तह ८८.७५ घ.मि. को २७ मिटर ग्याबियन ग्याबियन तटबन्ध निर्माण

कार्यान्वयन प्रक्रिया: खरिदको लागि दररेट माग प्रक्रिया

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: ५३८९७३

प्रभावकारिता: खोला कटान नियन्त्रण भई जग्गा जमिन संरक्षण

लाभान्वित घरधुरी: १५

रोजगारी श्रृजना: ५२ श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार १ वर्ष सम्म सम्बन्धित फर्म स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: श्री पालुस्थान निर्माण सेवा, सरावल ०१, नवलपरासी

संचालकको नाम: याम प्रसाद भुसाल

साइट इन्चार्ज: बालकृष्ण कार्की (ईन्जिनियर)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: बनकट्टी टोल तटबन्ध सैनामैना-११ (रुपन्देही)

स्थान: सैनामैना-११, रुपन्देही

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.६९६९९८ देशान्तर: ८३.२७११७८

उद्देश्य: खोला कटान नियन्त्रण गर्नुका साथै कटानले गर्दा जोखिममा रहेको जग्गा जमिन र बस्ति संरक्षण

निर्माण गरिएको संरचना: २ तह ७४ घ.मि. को २४ मिटर ग्याबियन ग्याबियन तटबन्ध निर्माण

कार्यान्वयन प्रक्रिया: खरिदको लागि दररेट माग प्रक्रिया

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: ५३८३७८

प्रभावकारिता: खोला कटान नियन्त्रण भई जग्गा जमिन तथा बस्ति संरक्षण

लाभान्वित घरधुरी: १७

रोजगारी श्रृजना: ५९ श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार १ वर्ष सम्म सम्बन्धित फर्म स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: श्री खेम कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि., सैनामैना १०, रुपन्देही

संचालकको नाम: लेखनाथ खनाल

साइट इन्चार्ज: बालकृष्ण कार्की (ईन्जिनियर)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: झिमपुर पहिला नदि तटबन्धन सैनामैना-१० (रुपन्देहि)

स्थान: सैनामैना-१०, रुपन्देहि

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.६९५२१७ देशान्तर: ८३.३२६३६

उद्देश्य: खोला कटान नियन्त्रण गर्नुका साथै कटानले गर्दा जोखिममा रहेको जग्गा जमिन र बस्ति संरक्षण

निर्माण गरिएको संरचना: ४ तह १२७.५ घ.मि. को १८ मिटर ग्याबियन ग्याबियन तटबन्ध निर्माण

कार्यान्वयन प्रक्रिया: खरिदको लागि दररेट माग प्रक्रिया

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: ७७४०४९

प्रभावकारिता: खोला कटान नियन्त्रण भई जग्गा जमिन तथा बस्ति संरक्षण

लाभान्वित घरधुरी: ६०

रोजगारी श्रृजना: ९६ श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार १ वर्ष सम्म सम्बन्धित फर्म स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी

कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: श्री कैलशपती निर्माण सेवा, सैनामैना ११

संचालकको नाम: देवि कन्देल

साइट इन्चार्ज: बालकृष्ण कार्की (ईन्जिनियर)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: कञ्चन नदिमा तटबन्ध निर्माण गैडहवा, ०६ (रुपन्देहि)

स्थान: गैडहवा ०६, रुपन्देहि

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.५९३७६९ देशान्तर: ८३.३१८९७६

उद्देश्य: खोला कटान नियन्त्रण गर्नुका साथै कटानले गर्दा जोखिममा रहेको जग्गा जमिन र बस्ति संरक्षण

निर्माण गरिएको संरचना: २ तह १५२ घ.मि. को ४६ मिटर ग्याबियन ग्याबियन तटबन्ध निर्माण

कार्यान्वयन प्रक्रिया: खरिदको लागि दररेट माग प्रक्रिया

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: ९६८१६६

प्रभावकारिता: खोला कटान नियन्त्रण भई जग्गा जमिन तथा बस्ति संरक्षण

लाभान्वित घरधुरी: ६७

रोजगारी श्रृजना: ११५ श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार १ वर्ष सम्म सम्बन्धित फर्म स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी

कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: श्री एस.आर देउराली कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स प्रा.लि.

संचालकको नाम: सिर्जना भुसाल बेलबासे

साइट इन्चार्ज: बालकृष्ण कार्की (ईन्जिनियर)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: बनराह खोला तटबन्ध निर्माण सैनामैना -९ (रुपन्देही)

स्थान: सैनामैना -९, रुपन्देही

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.७००५४ देशान्तर: ८३.२८६५२४

उद्देश्य: आकाशे तथा भलपानी संकलन गर्नुका साथै जमिनमूनि जल पुनर्भरण गरी भूमिगत पानीको सतह वृद्धि तथा तटबन्ध निर्माण

निर्माण गरिएको संरचना: (२५*१.५*२) मिटर ७० घ.मि. र (१००*८*२.७५) २२१५ घ.मि. प्रकृतिक तटबन्ध निर्माण

कार्यान्वयन प्रक्रिया: खरिदको लागि दररेट माग प्रक्रिया

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: ७७६०००

उपभोक्ताले बेहोर्ने रकम: ८७८४५

प्रभावकारिता: आकाशे तथा भलपानी संकलन भई जमिनमूनि जल पुनर्भरण र भूमिगत पानीको सतह वृद्धिमा टेवा पुगेको

लाभान्वित घरधुरी: २७

रोजगारी श्रृजना: १५५ श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार उपभोक्ता स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

उपभोक्ता समितिको नाम: श्री बनराह तटबन्धन निर्माण उपभोक्ता समिति, सैनामैना ०९, रुपन्देही

अध्यक्षको नाम: मिना भट्टराई

साइट इन्चार्ज: बालकृष्ण कार्की (इन्जिनियर)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: तुलबुलिया तटबन्ध सैनमैना-०५ (रुपन्देही)

स्थान: सैनमैना-०५, रुपन्देही

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.६९५४०९ देशान्तर: ८३.३२६३९८

उद्देश्य: खोला कटान नियन्त्रण गर्नुका साथै कटानले गर्दा जोखिममा रहेको जग्गा जमिन संरक्षण

निर्माण गरिएको संरचना: २ तह १२९ घ.मि. को ६५ मिटर ग्याबियन ग्याबियन तटबन्ध निर्माण

कार्यान्वयन प्रक्रिया: खरिदको लागि दररेट माग प्रक्रिया

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: ६२५१३२

प्रभावकारिता: खोला कटान नियन्त्रण भई जग्गा जमिन संरक्षण

लाभान्वित घरधुरी: १५

रोजगारी श्रृजना: १०५ श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार १ वर्ष सम्म सम्बन्धित फर्म स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: श्री कृष्ण कन्स्ट्रक्सन, बुटवल ०३, रुपन्देही

संचालकको नाम: मिना घिमिरे

साइट इन्चार्ज: बालकृष्ण कार्की (ईन्जिनियर)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: मण्डरखानी तटबन्ध निर्माण गैडहवा-०९ (रुपन्देही)

स्थान: गैडहवा-०९, रुपन्देही

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.६२७५१७ देशान्तर: ८३.३२५४०५

उद्देश्य: खोला कटान नियन्त्रण गर्नुका साथै कटानले गर्दा जोखिममा रहेको जग्गा जमिन संरक्षण

निर्माण गरिएको संरचना: ३ तह ११९.५ घ.मि. को २६ मिटर ग्याबियन ग्याबियन तटबन्ध निर्माण

कार्यान्वयन प्रक्रिया: खरिदको लागि दररेट माग प्रक्रिया

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: ७७४२८२

प्रभावकारिता: खोला कटान नियन्त्रण भई जग्गा जमिन संरक्षण

लाभान्वित घरधुरी: ५५

रोजगारी श्रृजना: १०७ श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार १ वर्ष सम्म सम्बन्धित फर्म स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: श्री स्वस्तिका सक्षम निर्माण सेवा

संचालकको नाम: कुल बहादुर बिसि

साइट इन्चार्ज: बालकृष्ण कार्की (ईन्जिनियर)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: दानब नदिमा तटबन्ध गैडहवा-०८ (रुपन्देहि)

स्थान: गैडहवा-०८, रुपन्देहि

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.६०६२२२ देशान्तर: ८३.३२७५०२

उद्देश्य: खोला कटान नियन्त्रण गर्नुका साथै कटानले गर्दा जोखिममा रहेको जग्गा जमिन संरक्षण

निर्माण गरिएको संरचना: २ तह १०५ घ.मि. को ३० मिटर ग्याबियन ग्याबियन तटबन्ध निर्माण

कार्यान्वयन प्रक्रिया: खरिदको लागि रेट माग प्रक्रिया

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: १२७५०१२

प्रभावकारिता: खोला कटान नियन्त्रण भई जग्गा जमिन संरक्षण

लाभान्वित घरधुरी: ५५

रोजगारी श्रृजना: २०० श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार १ वर्ष सम्म सम्बन्धित फर्म स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी

कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: श्री तेजभक्त निर्माण सेवा प्रा.लि.

संचालकको नाम: धन बहादुर ज्ञवाली

साइट इन्चार्ज: बालकृष्ण कार्की (ईन्जिनियर)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: इंगुरिया नदिमा तटबन्ध निर्माण, दमकडागैडहवा-०९ (रुपन्देही), सैनामैना -०८ (रुपन्देही), सुर्यनगर टोल, सैनामैना-०८ (रुपन्देही), पुलमुनी, सैनामैना -०८ (रुपन्देही), भटसी गाँउ पूर्व उत्तर, सैनामैना-०९ (रुपन्देही)

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क:

स्थान	अक्षांश	देशान्तर
भटसी गाँउ पूर्व उत्तर, सैनामैना-०९ (रुपन्देही)	२७.६९५४२४	८३.२९८३१३
सुर्यनगर टोल, सैनामैना-०८ (रुपन्देही)	२७.६९०६९७	८३.२९८२१
दमकडागैडहवा-०९ (रुपन्देही),	२७.६३१६९९	८३.३२८६५१
पुलमुनी, सैनामैना -०८ (रुपन्देही)	२७.६८६४७४	८३.३०१७२
सैनामैना -०८ (रुपन्देही)	२७.६९९४५१	८३.३०३०८१

उद्देश्य: खोला कटान नियन्त्रण साथै कटानले गर्दा जोखिममा रहेको जग्गा जमिन संरक्षण घरबस्ति संरक्षण

निर्माण गरिएको संरचना:

४ तह १९५ घ.मि. को ३० मिटर ग्याबियन ग्याबियन तटबन्ध निर्माण

३ तह २२३ घ.मि. को ४० मिटर ग्याबियन ग्याबियन तटबन्ध निर्माण

३ तह २३१ घ.मि. को ४२ मिटर ग्याबियन ग्याबियन तटबन्ध निर्माण

३ तह २२३ घ.मि. को ४० मिटर ग्याबियन ग्याबियन तटबन्ध निर्माण

४ तह २०९ घ.मि. को ३२ मिटर ग्याबियन ग्याबियन तटबन्ध निर्माण

कार्यान्वयन प्रक्रिया: खरिद प्रक्रिया

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: ४९७८७७८

प्रभावकारिता: खोला कटान नियन्त्रण भई जग्गा जमिन, घरबस्ति, पुल र बाटो संरक्षण

लाभान्वित घरधुरी: ९३

रोजगारी श्रृजना: ८५० श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार १ वर्ष सम्म सम्बन्धित फर्म स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: श्री देबका कन्स्ट्रक्सन, गौरिधारा ११, रुपन्देही

संचालकको नाम: जगत बहादुर थापा

साइट इन्चार्ज: बालकृष्ण कार्की (ईन्जिनियर)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: बोटानिकल पार्क निर्माण, रुपन्देही र तिलोत्तमा सामुदायिक पार्क निर्माण तथा व्यवस्थापन
तिलोत्तमा ६ रुपन्देही

स्थान: तिलोत्तमा ६, रुपन्देही

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.६४२८५४ देशान्तर: ८३.५१०१०६

उद्देश्य: पार्क संरक्षण तथा व्यवस्थापन

निर्माण गरिएको संरचना: काठको संरचना, प्यान्टिङ, टाएल, प्लास्टर, ईट्टा, ढुङ्गा र सिमेन्टको काम

कार्यान्वयन प्रक्रिया: खरिदको लागि दररेट माग प्रक्रिया

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: ३४०३६०४

प्रभावकारिता: खोला कटान नियन्त्रण भई जग्गा जमिन संरक्षण

लाभान्वित घरधुरी: पर्यटकहरु

रोजगारी श्रृजना: ४३० श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार १ वर्ष सम्म सम्बन्धित फर्म स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: श्री तेजभक्त निर्माण सेवा प्रा.लि.

संचालकको नाम: धन बहादुर ज्ञवाली

साइट इन्चार्ज: बालकृष्ण कार्की (ईन्जिनियर)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार ब्यबस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: मनोहरापुर र रानीबारी पोखरी संरक्षण कार्यक्रम, बुटवल उप म न पा १९ रुपन्देही

स्थान: बुटवल उप. म. न. पा. १९, रुपन्देही

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.६४९८०७ देशान्तर: ८३.४१४३१

उद्देश्य: आकाशे तथा भलपानी संकलन गर्नुका साथै जमिनमूनि जल पुनर्भरण गरी भूमिगत पानीको सतह वृद्धि गर्न

निर्माण गरिएको संरचना: पक्कि पर्खाल

कार्यान्वयन प्रक्रिया: खरिदको लागि दररेट माग

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: २,३१,२९७/७३

प्रभावकारिता: आकाशे तथा भलपानी संकलन भई जमिनमूनि जल पुनर्भरण र भूमिगत पानीको सतह वृद्धिमा टेवा पुगेको

लाभान्वित घरधुरी: १२

रोजगारी श्रृजना: ४६ श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार १ वर्ष सम्म सम्बन्धित फर्म स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी

कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: सम्राट कन्स्ट्रक्सन, रोहिणी ४ रुपन्देही

संचालकको नाम: यंजय प्रसाद बेलबासे

साइट इन्चार्ज: सुमित बस्नेत (सब - इन्जिनियर)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार ब्यबस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: श्री लोकेश्वोर मन्दिर परिषद र बस्ति संरक्षण तटबन्धन, देवदह नगरपालिका ५ रुपन्देही

स्थान: देवदह नगरपालिका ५, रुपन्देही

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.६४२०४४ देशान्तर: ८३.५९८६६२

उद्देश्य: भू क्षय नियन्त्रण गर्नुका साथै खोलाले गर्दा जोखिममा रहेको जग्गा जमिनको संरक्षण

निर्माण गरिएको संरचना: १५ मिटर तारजालीमा ढुंगा भरी तटबन्धन निर्माण (५०.४३ घ.मि.)

कार्यान्वयन प्रक्रिया: खरिदको लागि दररेट माग

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: ३,७९,६५८.३६

प्रभावकारिता: जमिन कटान रोकथाम तथा ग्रामिण सडकको संरक्षण

लाभान्वित घरधुरी: २८

रोजगारी श्रृजना: ७८ श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार १ वर्ष सम्म सम्बन्धित फर्म स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: डी. एण्ड पी. कन्स्ट्रक्सन

संचालकको नाम: दिलिप यादव

साइट इन्चार्ज: सुमित बस्नेत (सब - इन्जिनियर)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार ब्यबस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: जनीरा टॉल देखि रोहिणी पुलको उत्तरसम्मको खोला तटबन्धन योजना

स्थान: देवदह नगरपालिका बडा नं. १२, रुपन्देही

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.५४९९४८ देशान्तर: ८३.५३३८७६

उद्देश्य: भू क्षय नियन्त्रण गर्नुका साथै खोलाले गर्दा जोखिममा रहेको जग्गा जमिनको संरक्षण

निर्माण गरिएको संरचना: ३९ मिटर तारजालीमा ढुंगा भरी तटबन्धन निर्माण (३१२ घ.मि.)

कार्यान्वयन प्रक्रिया: बोलपत्र खरिद,

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: १६,१९,५५१/०६

प्रभावकारिता: कृषि योग्य जमिन कटान रोकथाम तथा संरक्षण

लाभान्वित घरधुरी: २४

रोजगारी श्रृजना: २३४ श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार १ वर्ष सम्म सम्बन्धित फर्म स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: देवका कन्स्ट्रक्सन प्रा. लि.

संचालकको नाम: जगत बहादुर थापा

साइट इन्चार्ज: सुमित बस्नेत (सब - इन्जिनियर)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



३.३ नवलपरासी (ब.सु.प.) जिल्लामा संचालित कार्यक्रमहरूको पार्श्वचित्र

कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: टिकाराम चापागाईको घर देखि पश्चिम तटबन्धन

स्थान: बर्दघाट नगरपालिका ०७, नवलपरासी (ब.सु.प.)

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.५१८५६४ देशान्तर: ८३.७९४१९२

उद्देश्य: खोला कटान नियन्त्रण गर्नुका साथै कटानले गर्दा जोखिममा रहेको जग्गा जमिन र गाँउबस्तीको संरक्षण

निर्माण गरिएको संरचना: २ तह ६० घ.मि. को २४ मिटर ग्याबियन ग्याबियन तटबन्ध निर्माण

कार्यान्वयन प्रक्रिया: खरिदको लागि दररेट माग प्रक्रिया

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: ३८७६९०

प्रभावकारिता: खोला कटान नियन्त्रण भई जग्गा जमिन र गाँउबस्तीको संरक्षण

लाभान्वित घरधुरी: १०

रोजगारी श्रृजना: ५५ श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार १ वर्ष सम्म सम्बन्धित फर्म स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: श्री सुसन कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.

संचालकको नाम: सुरज पाण्डे

साइट इन्चार्ज: बालकृष्ण कार्की (इन्जिनियर)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: बेलहानी खानेपानी टयाङ्की पछाडी जलाशय निर्माण

स्थान: बर्दघाट ५, नवलपरासी (ब.सु.प.)

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.५३७१३९ देशान्तर: ८३.८१५०७८

उद्देश्य: आकाशे तथा भलपानी संकलन गर्नुका साथै जमिनमूनि जल पुनर्भरण गरी भूमिगत पानीको सतह वृद्धि

निर्माण गरिएको संरचना: रिचार्ज पोखरी (८०*८०*१.५) मिटर १००८१ घ.मि.

कार्यान्वयन प्रक्रिया: खरिदको लागि दररेट माग

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: ७७५२६९

प्रभावकारिता: आकाशे तथा भलपानी संकलन भई जमिनमूनि जल पुनर्भरण र भूमिगत पानीको सतह वृद्धिमा टेवा पुगेको

लाभान्वित घरधुरी: खानेपानी उपभोक्ता

रोजगारी श्रृजना: १५ श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार १ वर्ष सम्म सम्बन्धित फर्म स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: श्री एस.पि निर्माण सेवा

संचालकको नाम: पार्वती पाण्डे

साइट इन्चार्ज: बालकृष्ण कार्की (ईन्जिनियर)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: सुनवल हिलपार्क भित्र पहिरो संरक्षण

स्थान: सुनवल नगरपालिका ०१, नवलपरासी (ब.सु.प.)

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.५१८५६४ देशान्तर: ८३.७९४१९२

उद्देश्य: खोला कटान नियन्त्रण गर्न बाटो र जग्गा जमिन संरक्षण

निर्माण गरिएको संरचना: २ तह ८८ घ.मि. को ३६ मिटर ग्याबियन ग्याबियन तटबन्ध निर्माण

कार्यान्वयन प्रक्रिया: खरिदको लागि दररेट माग प्रक्रिया

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: ५२००७८

प्रभावकारिता: खोला कटान नियन्त्रण भई बाटो र जमिन संरक्षण

लाभान्वित घरधुरी: पर्यटन

रोजगारी श्रृजना: ६६ श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार १ वर्ष सम्म सम्बन्धित फर्म स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: श्री अवतार निर्माण सेवा

संचालकको नाम: अब्दुल रजाक गद्दी मुसलमान

साइट इन्चार्ज: बालकृष्ण कार्की (ईन्जिनियर)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: नव जीवन पार्क बाढिप्रति संरक्षण

स्थान: बर्दघाट ४, नवलपरासी (ब.सु.प.)

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.५४२९५९ देशान्तर: ८३.७९३७२३

उद्देश्य: खोला कटान नियन्त्रण गर्नुका साथै पार्क संरक्षण

निर्माण गरिएको संरचना: २०.४ घ.मि. को (४०.८*०.५*१) मिटर बाउन्ड्री पर्खाल निर्माण

कार्यान्वयन प्रक्रिया: खरिदको लागि दररेट माग प्रक्रिया

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: ३८५९३९

प्रभावकारिता: खोला कटान नियन्त्रण भई जग्गा जमिन र गाँउबस्तीको संरक्षण

लाभान्वित घरधुरी: पर्यटन

रोजगारी श्रृजना: ६५ श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार १ वर्ष सम्म सम्बन्धित फर्म स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी

कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: श्री मानसी कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स

संचालकको नाम: जीवन श्रेष्ठ

साइट इन्चार्ज: बालकृष्ण कार्की (ईन्जिनियर)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: तुरिया नदिमा बनाईएको पुल देखि पश्चिम दक्षिण १०० मि पछि तुरिया नदि नियन्त्रण कार्यक्रम

स्थान: रामग्राम न.पा. १६, नवलपरासी (ब.सु.प.)

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.५१५०९९ देशान्तर: ८३.६०१२७

उद्देश्य: बस्ति तथा खेतबारी संरक्षणका लागि खोला कटान नियन्त्रण

निर्माण गरिएको संरचना: २१ मिटर ३ तह को ११२.२५ घ.मि. ग्याबियन तटबन्ध निर्माण

कार्यान्वयन प्रक्रिया: खरिदको लागि दररेट माग प्रक्रिया

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: ७७२११८

प्रभावकारिता: खोला कटान नियन्त्रण भई जग्गा जमिन र बस्ति संरक्षण

लाभान्वित घरधुरी: २०

रोजगारी श्रृजना: ९० श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार १ वर्ष सम्म सम्बन्धित फर्म स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: श्री जेशिका निर्माण सेवा, सरावल ०१, नवलपरासी

संचालकको नाम: हरि माया चौधरी

साइट इन्चार्ज: बालकृष्ण कार्की (ईन्जिनियर)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: फेचुहा बन्धारी टोलको खोलाको उत्तर तर्फ तटबन्धन.खोला नियन्त्रण

स्थान: सुस्ता १ नवलपरासी (ब.सु.प.)

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.४७५६०३ देशान्तर: ८३.८४३७९६

उद्देश्य: बस्ति तथा खेतबारी संरक्षणका लागि खोला कटान नियन्त्रण

निर्माण गरिएको संरचना: २१ मिटर ३ तह को १२३.७५ घ.मि. ग्याबियन तटबन्ध निर्माण

कार्यान्वयन प्रक्रिया: खरिदको लागि दररेट माग प्रक्रिया

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: ७७४५३०

प्रभावकारिता: खोला कटान नियन्त्रण भई जग्गा जमिन र बस्ति संरक्षण

लाभान्वित घरधुरी: २०

रोजगारी श्रृजना: ९० श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार १ वर्ष सम्म सम्बन्धित फर्म स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी

कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: श्री ओम निर्माण सेवा, सुस्ता २, नवलपरासी

संचालकको नाम: ओम प्रसाद न्यौपाने

साइट इन्चार्ज: बालकृष्ण कार्की (ईन्जिनियर)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: पुसाहा खोला र भोर्लावास खोला तटबन्धन

स्थान: सुनवल न.पा. ६, नवलपरासी (ब.सु.प.)

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.६२१३१८ देशान्तर: ८३.६५३९८४ र अक्षांश: २७.६३४६७ देशान्तर: ८३.६६२२०१

उद्देश्य: बस्ति तथा खेतबारी संरक्षणका लागि खोला कटान नियन्त्रण

निर्माण गरिएको संरचना: ३६ मिटर २ तह को ६३ घ.मि. र १२ मिटर ३ तह को ६४ घ.मि. ग्याबियन तटबन्ध निर्माण

कार्यान्वयन प्रक्रिया: खरिदको लागि दररेट माग प्रक्रिया

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: ७७५१४५

प्रभावकारिता: खोला कटान नियन्त्रण भई जग्गा जमिन र बस्ति संरक्षण

लाभान्वित घरधुरी: ६०

रोजगारी श्रृजना: १०७ श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार १ वर्ष सम्म सम्बन्धित फर्म स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: श्री तेजभक्त निर्माण सेवा प्रा.लि.

संचालकको नाम: धन बहादुर ज्ञवाली

साइट इन्चार्ज: बालकृष्ण कार्की (ईन्जिनियर)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: नगरस्तरिय दलित भवन सुनवल नजिक चारघरे कुलोमा तटबन्धन

स्थान: सुनवल नगरपालिका नवलपरासी (ब.सु.प.)

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.६२२३३ देशान्तर: ८३.६४०४

उद्देश्य: खोला कटान नियन्त्रण गर्नुका साथै बस्ति तथा कुलो संरक्षण

निर्माण गरिएको संरचना: २२ मिटर २ तह को ५७ घ.मि. ग्याबियन तटबन्ध निर्माण

कार्यान्वयन प्रक्रिया: खरिदको लागि दररेट माग प्रक्रिया

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: ३८७७६९

प्रभावकारिता: खोला कटान नियन्त्रण भई जग्गा जमिन र कुलो संरक्षण

लाभान्वित घरधुरी: २२

रोजगारी श्रृजना: ५५ श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार १ वर्ष सम्म सम्बन्धित फर्म स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी

कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: श्री नम्सु निर्माण सेवा प्रा.लि.

संचालकको नाम: नर बहादुर थापा

साइट इन्चार्ज: बालकृष्ण कार्की (ईन्जिनियर)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: ग्याङ्गदी खोलामा तटबन्धन निर्माण

स्थान: सुनवल नगरपालिका ०४, नवलपरासी (ब.सु.प.)

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.६१४२६७ देशान्तर: ८३.६३६४५९

उद्देश्य: बस्ति तथा खेतबारी संरक्षणका लागि खोला कटान नियन्त्रण

निर्माण गरिएको संरचना: २३ मिटर ३ तह को १२० घ.मि. ग्याबियन तटबन्ध निर्माण

कार्यान्वयन प्रक्रिया: खरिदको लागि दररेट माग प्रक्रिया

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: ७७५०४४

प्रभावकारिता: खोला कटान नियन्त्रण भई जग्गा जमिन र गाँउबस्तीको संरक्षण

लाभान्वित घरधुरी: ४५

रोजगारी श्रृजना: १०७ श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार १ वर्ष सम्म सम्बन्धित फर्म स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी

कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: श्री शिव शक्ति रियल स्टेट एन्ड सौरभ कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.

संचालकको नाम: राम बहादुर भन्डारी

साइट इन्चार्ज: बालकृष्ण कार्की (ईन्जिनियर)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: जर्गाहा १० विघा घोला नियन्त्रण तथा तटबन्ध

स्थान: सुनवल न.पा. ११, नवलपरासी (ब.सु.प.)

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.५९४१६७ देशान्तर: ८३.७१५२१३

उद्देश्य: बस्ति तथा खेतबारी संरक्षणका लागि खोला कटान नियन्त्रण

निर्माण गरिएको संरचना: ४ ठाउमा को २०२ घ.मि. ग्याबियन चेकड्याम निर्माण

कार्यान्वयन प्रक्रिया: खरिदको लागि दररेट माग प्रक्रिया

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: ८७३२९२

प्रभावकारिता: खोला कटान नियन्त्रण भई जग्गा जमिन र गाँउबस्तीको संरक्षण

लाभान्वित घरधुरी: २२

रोजगारी श्रृजना: १६४ श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार १ वर्ष सम्म सम्बन्धित फर्म स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी

कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: श्री ओम निर्माण सेवा, सुस्ता २, नवलपरासी

संचालकको नाम: ओम प्रसाद न्यौपाने

साइट इन्चार्ज: बालकृष्ण कार्की (ईन्जिनियर)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: दिव्यनगर खोला तटबन्धन पार्क नजिक तटबन्धन

स्थान: बर्दघाट ४, नवलपरासी (ब.सु.प.)

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.५६३९७६ देशान्तर: ८३.७८२५९२

उद्देश्य: पार्क संरक्षणका लागि खोला कटान नियन्त्रण

निर्माण गरिएको संरचना: २ तहको ६० मिटरको २०८ घ.मि. ग्याबियन चेकड्याम निर्माण

कार्यान्वयन प्रक्रिया: खरिदको लागि दररेट माग प्रक्रिया

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: ७९१५९३

प्रभावकारिता: खोला कटान नियन्त्रण भई जग्गा जमिन र पार्क संरक्षण

लाभान्वित घरधुरी: २३

रोजगारी श्रृजना: १७० श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार १ वर्ष सम्म सम्बन्धित फर्म स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी

कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: श्री ओम निर्माण सेवा, सुस्ता २, नवलपरासी

संचालकको नाम: ओम प्रसाद न्यौपाने

साइट इन्चार्ज: बालकृष्ण कार्की (ईन्जिनियर)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: सयपत्रि नेपाल विद्यालय पछाडी खोलामा तटबन्धन

स्थान: बर्दघाट १४, नवलपरासी (ब.सु.प.)

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.५०३३९६ देशान्तर: ८३.७८७७४६

उद्देश्य: विद्यालय तथा जमिन संरक्षणका लागि खोला कटान नियन्त्रण

निर्माण गरिएको संरचना: ३ तहको ४२ मिटरको २१३ घ.मि. ग्याबियन चेकड्याम निर्माण

कार्यान्वयन प्रक्रिया: खरिदको लागि दररेट माग प्रक्रिया

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: ८७६५५७

प्रभावकारिता: खोला कटान नियन्त्रण भई जग्गा जमिन र विद्यालय संरक्षण

लाभान्वित घरधुरी: २५

रोजगारी श्रृजना: १७५ श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार १ वर्ष सम्म सम्बन्धित फर्म स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: श्री ओम निर्माण सेवा, सुस्ता २, नवलपरासी

संचालकको नाम: ओम प्रसाद न्यौपाने

साइट इन्चार्ज: बालकृष्ण कार्की (ईन्जिनियर)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: कर्महना टोलको खोलाको पुर्व तर्फको तटबन्धन ४० मी लम्बाई सुस्ता गा. पा. १

स्थान: सुस्ता गा. पा. १, नवलपरासी (ब.सु.प.)

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.४८२८०४ देशान्तर: ८३.८४७६३९

उद्देश्य: खोला कटान नियन्त्रण गर्नुका साथै कटानले गर्दा जोखिममा रहेको जग्गा जमिन र गाँउबस्तीको संरक्षण

निर्माण गरिएको संरचना: ३ तह ६५.२५ घ.मि. को १२ मिटर ग्याबियन ग्याबियन तटबन्ध निर्माण

कार्यान्वयन प्रक्रिया: खरिदको लागि दररेट माग प्रक्रिया

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: ३८५४४४

प्रभावकारिता: खोला कटान नियन्त्रण भई जग्गा जमिन र गाँउबस्तीको संरक्षण

लाभान्वित घरधुरी: १५

रोजगारी श्रृजना: ३८ श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार १ वर्ष सम्म सम्बन्धित फर्म स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: लाङघाली एस. बि. बिल्डर्स सप्लायर्स, किर्तिपुर १

संचालकको नाम: खुम बहादुर सारु

साइट इन्चार्ज: सन्दीप चौधरी (व.भू.सं.अ)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: भुसनापुर पुल देखि दक्षिण विधालयको जग्गा भुक्षय नियन्त्रण तथा तटबन्धन

स्थान: रामग्राम न.पा. १४, नवलपरासी (ब.सु.प.)

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.५५९४७ देशान्तर: ८३.६३१९८६

उद्देश्य: खोला कटान नियन्त्रण गर्नुका साथै कटानले गर्दा जोखिममा रहेको जग्गा जमिन संरक्षण

निर्माण गरिएको संरचना: ३ तह ६२ घ.मि. को १२ मिटर ग्याबियन ग्याबियन तटबन्ध निर्माण

कार्यान्वयन प्रक्रिया: खरिदको लागि दररेट माग प्रक्रिया

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: ३८४६५९

प्रभावकारिता: खोला कटान नियन्त्रण भई जग्गा जमिनको संरक्षण

लाभान्वित घरधुरी: ८

रोजगारी श्रृजना: ३८ श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार १ वर्ष सम्म सम्बन्धित फर्म स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी

कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: अंकित कन्स्ट्रक्सन, रामग्राम १६, नवलपरासी

संचालकको नाम: अंकित यादव

साइट इन्चार्ज: सन्दीप चौधरी (व.भू.सं.अ)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: महाउ खोलामा तटबन्धन

स्थान: रामग्राम न.पा. १६, नवलपरासी (ब.सु.प.)

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.५०३८४८ देशान्तर: ८३.४९६३४३

उद्देश्य: खोला कटान नियन्त्रण गर्नुका साथै कटानले गर्दा जोखिममा रहेको जग्गा जमिन संरक्षण

निर्माण गरिएको संरचना: ३ तह ६२ घ.मि. को १२ मिटर ग्याबियन ग्याबियन तटबन्ध निर्माण

कार्यान्वयन प्रक्रिया: खरिदको लागि दररेट माग प्रक्रिया

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: ३८६१७७

प्रभावकारिता: खोला कटान नियन्त्रण भई जग्गा जमिनको संरक्षण

लाभान्वित घरधुरी: १५

रोजगारी श्रृजना: ३८ श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार १ वर्ष सम्म सम्बन्धित फर्म स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी

कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: प्रत्युष कन्स्ट्रक्सन, रामग्राम ९, नवलपरासी

संचालकको नाम: मुक्ति नरायण यादव

साइट इन्चार्ज: सन्दीप चौधरी (व.भू.सं.अ)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: जनता मावि डैनाहवा घिवल पुलको उत्तर पट्टि तटबन्धन तुरिया नदी

स्थान: रामग्राम न.पा. १४, नवलपरासी (ब.सु.प.)

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.५५९५८९ देशान्तर: ८३.६३१९२०

उद्देश्य: खोला कटान नियन्त्रण गर्नुका साथै कटानले गर्दा जोखिममा रहेको जग्गा जमिन संरक्षण

निर्माण गरिएको संरचना: २ तह ५८.५ घ.मि. को १८ मिटर ग्याबियन ग्याबियन तटबन्ध निर्माण

कार्यान्वयन प्रक्रिया: खरिदको लागि दररेट माग प्रक्रिया

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: ३८३९००

प्रभावकारिता: खोला कटान नियन्त्रण भई जग्गा जमिनको संरक्षण

लाभान्वित घरधुरी: ८

रोजगारी श्रृजना: ३५ श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार १ वर्ष सम्म सम्बन्धित फर्म स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: मानुषी कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि. बर्दघाट ९ नवलपरासी

संचालकको नाम: जिवन श्रेष्ठ

साइट इन्चार्ज: सन्दीप चौधरी (व.भू.सं.अ)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: दिव्य शान्ति ईको पार्कमा तटबन्धन र सौन्दर्यीकरण

स्थान: बर्दघाट न.पा. ४, नवलपरासी (ब.सु.प.)

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क:

अक्षांश: २७.५६४९२५

देशान्तर: ८३.७८४३७४

उद्देश्य: दिव्य शान्ति पार्क संरक्षण तथा व्यवस्थापन

निर्माण गरिएको संरचना: चेनल्लिक बाउन्ड्री फेन्सिङ

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: ३८६३०५

प्रभावकारिता: लगभग ७८.५ मि. लम्बाइ र १.४ मिटर उचाइको १०९.९ ब.मि. क्षेत्रफलमा चेनल्लिक बाउन्ड्री फेन्सिङ

लाभान्वित घरधुरी: पर्यटक स्थानिय

रोजगारी श्रृजना: ६१ श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार उ.स. स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी कार्यालयबाट अन्तिम

भुक्तानी दिँदा ५% धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: सम्झना कन्स्ट्रक्सन, नवलपरासी

संचालकको नाम: सम्झना केवट

साइट इन्चार्ज: बालकृष्ण कार्कि (ईन्जिनियर)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: कुस्हा खोलामा भूक्षय तटबन्धन

स्थान: पाल्हीनन्दन गा. पा. ४, नवलपरासी

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.४८७९११ देशान्तर: ८३.६५६४२९

उद्देश्य: भू क्षय तथा खोला कटान नियन्त्रण

निर्माण गरिएको संरचना: २२ मि. लम्बाई ०.६३ मि चौडाइ र १.८ मि. उचाइको २५.९४ घ.मि. मेसिनरी रिटेनिंग वाल

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु:

प्रभावकारिता: बाटो तथा खोला कटान संरक्षण

लाभान्वित घरधुरी: २०

रोजगारी श्रृजना: १४५ श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार उ.स. स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: प्रत्युष कन्स्ट्रक्सन, रामग्राम ९, नवलपरासी

संचालकको नाम: मुक्ति नरायण यादव

साइट इन्चार्ज: सन्दीप चौधरी (व.भू.सं.अ)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: रतनपुरा देखि सुर्यपुरा पावरहाउस पश्चिम खोलामा पूर्वतिर तटबन्धन

स्थान: प्रतापपुर ७, नवलपरासी (ब.सु.प.)

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.४३०९२६ देशान्तर: ८३.७९४८५६

उद्देश्य: खोला कटान नियन्त्रण गर्नुका साथै कटानले गर्दा जोखिममा रहेको जग्गा जमिन संरक्षण

निर्माण गरिएको संरचना: ३ तह ६५.२५ घ.मि. को १२ मिटर ग्याबियन ग्याबियन तटबन्ध निर्माण

कार्यान्वयन प्रक्रिया: खरिदको लागि दररेट माग प्रक्रिया

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: ३८३८९२

प्रभावकारिता: खोला कटान नियन्त्रण भई जग्गा जमिनको संरक्षण

लाभान्वित घरधुरी: १०

रोजगारी श्रृजना: ४० श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार १ वर्ष सम्म सम्बन्धित फर्म स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी

कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: मा गंगोत्री निर्माण सेवा, सुस्ता ५, नवलपरासी

संचालकको नाम: रविन्द्र कुमार बानिया

साइट इन्चार्ज: सन्दीप चौधरी (व.भू.सं.अ)

सम्पादित क्रिया कलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: खोलाको छेउछेउमा बाँस रोपण तथा वायो इन्जिनियरिङ कार्य

स्थान: रामग्राम न.पा. १७, नवलपरासी (ब.सु.प.)

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.४७९७५

देशान्तर: ८३.६९६७३४

उद्देश्य: खोला किनारका सार्वजनिक जग्गामा बास रोपण गरी खोला किनार संरक्षण

निर्माण गरिएको संरचना: बासको कट्टिड १५०० आप १०० लिचि १०० बिरुवा खरिद, वितरण तथा रोपण

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: ३८३५८०

प्रभावकारिता: खोला किनार बासले जैबिक बाधको रुपमा स्थापना हुनु र स्थानिय स्रोतको रुपमा बिकास हुनु ।

लाभान्वित घरधुरी: ५०

रोजगारी श्रृजना: ९० श्रमदिन


मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण स्थानिय उपभोक्ताहरुबाट हुनेछ ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: जेशिका निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि.. सरावल १ नवलपरासी

संचालकको नाम: किशोर कुमार चौधरी

साइट इन्चार्ज: सन्दीप चौधरी (व.भू.सं.अ)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:

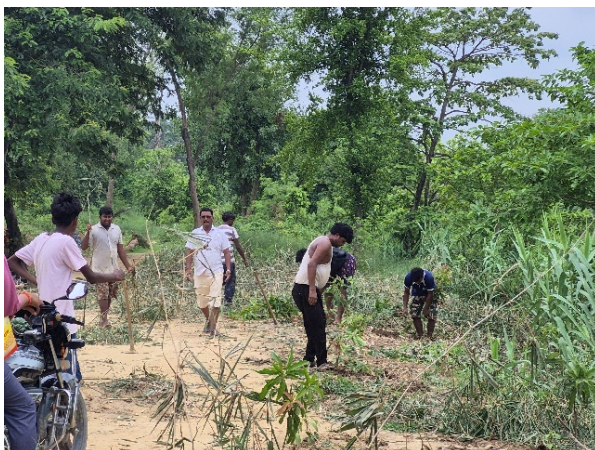

कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: वायोइन्जिनियरिङ प्रविधि प्रयोग गरी चिसापानी खोला संरक्षण

स्थान: दिव्यज्योती क्याम्पस, बर्दघाट नगरपालिका ०२, चिसापानी, नवलपरासी (ब.सु.प.)

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.५५६९२१ देशान्तर: ८३.७७६८४

उद्देश्य: खोला किनारका ग्याबियन तटबन्धन र फलफुल तथा बास रोपण गरी खोला किनार संरक्षण

निर्माण गरिएको संरचना: ग्याबियन तटबन्ध ३० मिटर ३० घ. मि. तथा बासको कट्टिङ २६० आप ३१५ लिचि ३०० बिरुवा खरिद, वितरण तथा रोपण

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: ३७८६७८

प्रभावकारिता: ग्याबियन तटबन्ध र फलफुल तथा बास रोपणबाट खोला किनार संरक्षण तथा आयस्रोत

लाभान्वित घरधुरी: क्याम्पस परिसर

रोजगारी श्रृजना: ८० श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार को लागी कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको र बिरुवा संरक्षण सम्बन्धित निकायले गर्नेछन ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: पालुस्थान निर्माण सेवा, सरावल २, नवलपरासी

संचालकको नाम: यम प्रसाद भुषाल

साइट इन्चार्ज: सन्दीप चौधरी (व.भू.सं.अ)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: सुस्ता नारायणी नदीको किनारमा बास (राईजोम) रोपण

स्थान: सुस्ता ५, नवलपरासी (ब.सु.प.)

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.३६०८९२

देशान्तर: ८३.८६२६६१

उद्देश्य: खोला किनारका सार्वजनिक जग्गामा बास रोपण गरी खोला किनार संरक्षण

निर्माण गरिएको संरचना: बासको कट्टिड १५०० आप १०० लिचि १०० बिरुवा खरिद, वितरण तथा रोपण

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: ३८३५८०

प्रभावकारिता: खोला किनार बासले जैविक बाधको रुपमा स्थापना हुनु र स्थानिय स्रोतको रुपमा बिकास हुनु ।

लाभान्वित घरधुरी: १००

रोजगारी श्रृजना: ९० श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण स्थानिय जनताहरुले गर्नेछन ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: बि एम पि कस्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि., गढवा १, दाङ

संचालकको नाम: बिर बहादुर पुन

साइट इन्चार्ज: सन्दीप चौधरी (व.भू.सं.अ)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: जडिबुटी विकास कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)

क्रियाकलापको नाम: कृषि वन प्रणाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम (सामुदायिक तथा कबुलियती वनमा फलफूल तथा बहुउपयोगी विरुवा रोपण तथा संरक्षण)

स्थान: पाल्पा (पुर्वखोला र निस्दी गा.पा. कबुलियती वन)

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.७७२६९१ देशान्तर: ८३.७७१०६८

उद्देश्य: कबुलियति वन समुहलाई ओखरको बिरुवा बितरण

निर्माण गरिएको संरचना: पुर्वखोला र निस्दी गा.पा.का कबुलियति वन समुहलाई ५००० गोटा ओखरका बिरुवा वितरण

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: ३९२५००

प्रभावकारिता: भबिस्यमा ओखरबाट आम्दानी लिन सकिने छ ।

लाभान्वित घरधुरी: २००

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार स्थानिय समुहले गर्ने छन ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: दिदिबहिनी कृषि वन, नर्सरी तथा सप्लायर्स

संचालकको नाम: झबिलाल चुहान

साइट इन्चार्ज: सन्दीप चौधरी (व.भू.सं.अ)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: झरि खोलामा नदी तटबन्धन निर्माण

स्थान: रामग्राम नगरपालिका ७, नवलपरासी (ब.सु.प.)

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.५०१७९६ देशान्तर: ८३.६८८५१५

उद्देश्य: खोला कटान नियन्त्रण गर्नुका साथै कटानले गर्दा जोखिममा रहेको बाटो तथा जग्गा जमिन संरक्षण

निर्माण गरिएको संरचना: ४ तह १२६ घ.मि. को २१ मिटर ग्याबियन ग्याबियन तटबन्ध निर्माण

कार्यान्वयन प्रक्रिया: खरिदको लागि दररेट माग प्रक्रिया

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: ७७१९९५९

प्रभावकारिता: खोला कटान नियन्त्रण भई जग्गा जमिनको संरक्षण

लाभान्वित घरधुरी: २०

रोजगारी श्रृजना: ८० श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार १ वर्ष सम्म सम्बन्धित फर्म स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: लुम्बिनी कन्स्ट्रक्सन एण्ड बिल्डर्स, रामग्राम ९, नवलपरासी

संचालकको नाम: केशवराज यादव

साइट इन्चार्ज: सन्दीप चौधरी (व.भू.सं.अ)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: गणेशपुर धनेवा खोलामा तटबन्धन निर्माण

स्थान: सरावल गा. पा. ७, नवलपरासी (ब.सु.प.)

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.४२९८३८ देशान्तर: ८३.७३८१२१

उद्देश्य: खोला कटान तथा बाढि नियन्त्रण गर्नुका साथै जोखिममा रहेको बाटो तथा जग्गा जमिन संरक्षण

निर्माण गरिएको संरचना: २७० मिटर १७०० घ.मि. माटोको र २१ मिटर ढुङ्गाको तटबन्ध निर्माण

कार्यान्वयन प्रक्रिया: खरिदको लागि दररेट माग प्रक्रिया

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: ७५८२६९

प्रभावकारिता: खोला कटान नियन्त्रण भई जग्गा जमिनको संरक्षण

लाभान्वित घरधुरी: ५०

रोजगारी श्रृजना: ५० श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार १ वर्ष सम्म सम्बन्धित फर्म स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: शिव निर्माण सेवा, प्रतापपुर ६, नवलपरासी

संचालकको नाम: सन्जयमणी त्रिपाठी

साइट इन्चार्ज: सन्दीप चौधरी (व.भू.सं.अ)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: रजहवा वनवाटिकाको दक्षिण तटबन्धन निर्माण

स्थान: सरावल गा. पा. १, नवलपरासी (ब.सु.प.)

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.५८५०५७ देशान्तर: ८३.७२६४२५

उद्देश्य: खोला कटान तथा जोखिममा रहेको बस्ति जग्गा जमिन संरक्षण

निर्माण गरिएको संरचना: ३९ मिटर १२९ घ.मि. ग्याबियन तटबन्ध निर्माण

कार्यान्वयन प्रक्रिया: खरिदको लागि दररेट माग प्रक्रिया

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: ७७१२९०

प्रभावकारिता: खोला कटान नियन्त्रण भई जग्गा जमिनको संरक्षण

लाभान्वित घरधुरी: २०

रोजगारी श्रृजना: ८० श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार १ वर्ष सम्म सम्बन्धित फर्म स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी

कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: विराज कन्स्ट्रक्सन, सरावल १, नवलपरासी

संचालकको नाम: दिवस रेग्मी

साइट इन्चार्ज: सन्दीप चौधरी (व.भू.सं.अ)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: झरही नदी नियन्त्रण कुर्थावल पुलपारी

स्थान: सरावल ६, नवलपरासी (ब.सु.प.)

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.४४५९३१ देशान्तर: ८३.७१०९५१

उद्देश्य: खोला कटान तथा जोखिममा रहेको बस्ति जग्गा जमिन संरक्षण

निर्माण गरिएको संरचना: ५८ मिटर १२४.५ घ.मि. ग्याबियन तटबन्ध निर्माण

कार्यान्वयन प्रक्रिया: खरिदको लागि दररेट माग प्रक्रिया

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: ७६८४९३३

प्रभावकारिता: खोला कटान नियन्त्रण भई जग्गा जमिनको संरक्षण

लाभान्वित घरधुरी: १५

रोजगारी श्रृजना: ८० श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार १ वर्ष सम्म सम्बन्धित फर्म स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: सत्यदेवी कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि., सुनवल १२, नवलपरासी

संचालकको नाम: राजेन्द्र बहादुर थापा क्षेत्री

साइट इन्चार्ज: सन्दीप चौधरी (व.भू.सं.अ)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: पट्खोली पुल देखि उत्तर तर्फ सरावलको सिमाना पुर्व दक्षिण नदी नियन्त्रण

स्थान: रामग्राम न.पा. १७, नवलपरासी (ब.सु.प.)

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.५२८२१९ देशान्तर: ८३.७०३६८४

उद्देश्य: खोला कटान तथा जोखिममा रहेको जग्गा जमिन संरक्षण

निर्माण गरिएको संरचना: २४ मिटर ३ तह १२६ घ.मि. ग्याबियन तटबन्ध निर्माण

कार्यान्वयन प्रक्रिया: खरिदको लागि दररेट माग प्रक्रिया

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: ७७०६१०

प्रभावकारिता: खोला कटान नियन्त्रण भई जग्गा जमिनको संरक्षण

लाभान्वित घरधुरी: १०

रोजगारी श्रृजना: ८० श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार १ वर्ष सम्म सम्बन्धित फर्म स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: जेभि कन्स्ट्रक्सन, सरावल १, नवलपरासी

संचालकको नाम: बिसन भण्डारी

साइट इन्चार्ज: सन्दीप चौधरी (व.भू.सं.अ)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: चोर्निया घोलामा नर्सरी जाने बाटोको पुल देखि उत्तर पूर्व तटबन्धन

स्थान: प्रतापपुर गाउँपालिका ८, नवलपरासी (ब.सु.प.)

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.४३४९७६ देशान्तर: ८३.८३६६१२

उद्देश्य: खोला कटान तथा जोखिममा रहेको जग्गा जमिन संरक्षण

निर्माण गरिएको संरचना: २४ मिटर ३ तह १२६ घ.मि. ग्याबियन तटबन्ध निर्माण

कार्यान्वयन प्रक्रिया: खरिदको लागि दररेट माग प्रक्रिया

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: ७७४७३७

प्रभावकारिता: खोला कटान नियन्त्रण भई जग्गा जमिनको संरक्षण

लाभान्वित घरधुरी: १०

रोजगारी श्रृजना: ८० श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार १ वर्ष सम्म सम्बन्धित फर्म स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: महादेव कन्स्ट्रक्सन, प्रतापपुर ५, नवलपरासी

संचालकको नाम: जय प्रकाश कलवार

साइट इन्चार्ज: सन्दीप चौधरी (व.भू.सं.अ)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: धनेवा नदी कटान नियन्त्रण

स्थान: रामग्राम न.पा. १७, नवलपरासी (ब.सु.प.)

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.४८००५७ देशान्तर: ८३.६९६७१८

उद्देश्य: खोला कटान तथा जोखिममा रहेको जग्गा जमिन संरक्षण

निर्माण गरिएको संरचना: २४ मिटर ३ तह १२६ घ.मि. ग्याबियन तटबन्ध निर्माण

कार्यान्वयन प्रक्रिया: खरिदको लागि दररेट माग प्रक्रिया

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: ७७१११२

प्रभावकारिता: खोला कटान नियन्त्रण भई जग्गा जमिनको संरक्षण

लाभान्वित घरधुरी: २०

रोजगारी श्रृजना: ८० श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार १ वर्ष सम्म सम्बन्धित फर्म स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: सि लाइट कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि., मध्यपुर थिमि

संचालकको नाम: प्रकाश श्रेष्ठ

साइट इन्चार्ज: सन्दीप चौधरी (व.भू.सं.अ)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: रायपुरवा खोला नेपाली नहरको पुल देखि उत्तर तिर तटबन्धन,

स्थान: सुस्ता गा.पा. १, नवलपरासी (ब.सु.प.)

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.४७९४९४ देशान्तर: ८३.८४७७३२

उद्देश्य: खोला कटान तथा जोखिममा रहेको जग्गा जमिन संरक्षण

निर्माण गरिएको संरचना: ४१ मिटर ३ तह २०८।७५ घ.मि. ग्याबियन तटबन्ध निर्माण

कार्यान्वयन प्रक्रिया: खरिदको लागि दररेट माग प्रक्रिया

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: ८७९७२९

प्रभावकारिता: खोला कटान नियन्त्रण भई जग्गा जमिनको संरक्षण

लाभान्वित घरधुरी: १५

रोजगारी श्रृजना: १२० श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार १ वर्ष सम्म सम्बन्धित फर्म स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: ओम निर्माण सेवा, सुस्ता २, नवलपरासी

संचालकको नाम: ओम प्रकाश न्यौपाने

साइट इन्चार्ज: सन्दीप चौधरी (व.भू.सं.अ)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

क्रियाकलापको नाम: चिसापानी घोला कटान नियन्त्रण

स्थान: बर्दघाट न.पा. २, नवलपरासी (ब.सु.प.)

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.५५३१७८ देशान्तर: ८३.७७३८१९

उद्देश्य: खोला कटान तथा जोखिममा रहेको जग्गा जमिन संरक्षण

निर्माण गरिएको संरचना: १४ मिटर १ तह २८ घ.मि. ग्याबियन तटबन्ध निर्माण

कार्यान्वयन प्रक्रिया: खरिदको लागि दररेट माग प्रक्रिया

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: ९४८६६

प्रभावकारिता: खोला कटान नियन्त्रण भई जग्गा जमिनको संरक्षण

लाभान्वित घरधुरी: १०

रोजगारी श्रृजना: २० श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार १ वर्ष सम्म सम्बन्धित फर्म स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: सत्यपती कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि., सुनवल १२, नवलपरासी

संचालकको नाम: राजेन्द्र थापा क्षेत्री

साइट इन्चार्ज: सन्दीप चौधरी (व.भू.सं.अ)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:



कार्यक्रमको नाम: जलाधार संरक्षण तथा सिमसार ब्यबस्थापन कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)

क्रियाकलापको नाम: रुद्रवेणी बडीगाड तटबन्ध, सत्यवती १, गुल्मी र बर्दघाट खानेपानी तथा जलाधार संरक्षण, बर्दघाट, नवलपरासी

स्थान: सत्यवती १, गुल्मी र बर्दघाट, नवलपरासी

जि.पि.एस. निर्देशाङ्क: अक्षांश: २७.९७६३७३ र २७.५४३३४७ देशान्तर: ८३.४६६९५९ र ८३.७९०२३८

उद्देश्य: बडीगाड खोला तटबन्धन तथा किनार संरक्षण र बर्दघाट खानेपानीमा सिमसार ब्यबस्थापन

निर्माण गरिएको संरचना: ११० मिटर तारजालीमा ढुंगा भरी तटबन्धन निर्माण (३६८.५० घ.मि.)

कार्यान्वयन प्रक्रिया: बोलपत्र खरिद,

लागत रकम: कार्यालयको तर्फबाट रु: १७,५८,७९९.६५

प्रभावकारिता: बडीगाड खोला तटबन्धन तथा किनार संरक्षण र बर्दघाट खानेपानीमा सिमसार ब्यबस्थापनमा टेवा पुग्ने
लाभान्वित घरधुरी: १७६ **रोजगारी श्रृजना:** ५४८ श्रमदिन

मर्मत सम्भार: उक्त कार्यको संरक्षण एवं मर्मत सम्भार १ वर्ष सम्म सम्बन्धित फर्म स्वयंले नै गर्ने र मर्मत सम्भारको लागी कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत धरौटी रकम समेत कट्टा गरिएको ।

निर्माण व्यवसायी फर्मको नाम: ड्रोन कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा. लि.

संचालकको नाम: यज्ञ पाण्डे

साइट इन्चार्ज: सुमित बस्नेत (सब - इन्जिनियर)

सम्पादित क्रियाकलापको तस्बिर:




खण्ड ४: सम्पादित कार्यक्रम र मुख्य उपलब्धि


४.१ सम्पादित कार्यक्रम तथा क्रियाकलापको विवरण

योजना/ जिल्ला	भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम	जलाधार संरक्षण तथा सिमसार व्यवस्थापन कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)	वातावरण विभाग (संघ शसर्त अनुदान)	जम्मा योजना
पाल्पा	३०	२	१	३३
रुपन्देही	२४	०	१	२५
नवलपरासी (ब.सु.प.)	३१	०	०	३२
गुल्मी र नवलपरासी	०	१	०	१
जम्मा	८६	३	२	९१

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा यस कार्यालयद्वारा कार्यालयको कार्यक्षेत्र पाल्पा, रुपन्देही र नवलपरासी (ब.सु.प.) जिल्लामा भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत ८६ वटा क्रियाकलापहरु/योजनाहरु र संघ शसर्त अनुदान अन्तर्गत जलाधार संरक्षण तथा सिमसार व्यवस्थापन कार्यक्रम र वातावरण विभाग कार्यक्रम शिर्षक अन्तर्गत ५ वटा गरी जम्मा ९१ वटा क्रियाकलाप तथा योजनाहरु १०१ स्थानमा कार्यान्वयन एवं सम्पादन गरिएको छ । जस मध्ये कार्यक्रम तर्फ हेर्दा ७० स्थानमा विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन, १९ स्थानमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रम, ८ स्थानमा जलाधार संरक्षण तथा सिमसार व्यवस्थापन कार्यक्रम र ४ स्थानमा विकासका पूर्वाधार संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन भएका छन भने क्रियाकलापहरु तर्फ हेर्दा ५६ स्थानमा खहरे नियन्त्रण तथा खोला किनारा संरक्षण, १२ स्थानमा पहिरो नियन्त्रण तथा रोकथाम, १० स्थानमा रिचार्ज पोखरी निर्माण, ९ स्थानमा गल्छी तथा खोल्साखोल्सी नियन्त्रण, ७ स्थानमा परम्परागत पोखरी व्यवस्थापन, ५ स्थानमा पार्क निर्माण/सौन्दर्यीकरण र ३ स्थानमा पानी मुहान सिमसार क्षेत्र संरक्षणका कार्यक्रम कार्यालयद्वारा यस आ.व. २०८२/०८३ मा सम्पादन गरिएको छ ।


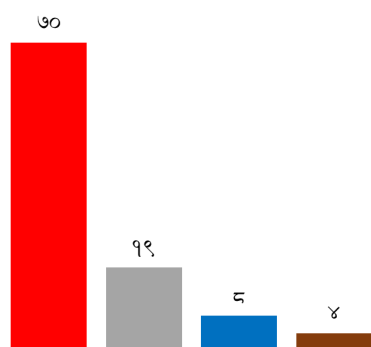


- विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन
- जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रम
- जलाधार संरक्षण तथा सिमसार व्यवस्थापन कार्यक्रम
- विकासका पूर्वाधार संरक्षण कार्यक्रम

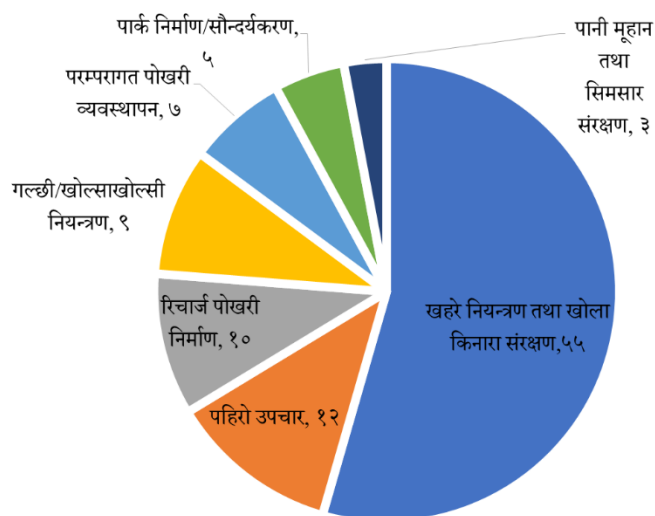

४.२ सम्पादित क्रियाकलाप/योजनाको नक्शांकन


आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा यस कार्यालयद्वारा कार्यालयको कार्यक्षेत्र पाल्पा, रुपन्देही र नवलपरासी (ब.सु.प.) जिल्लाका विभिन्न स्थानमा सम्पादित ९१ वटा क्रियाकलाप तथा योजनाहरूको १०१ स्थानमा भएको कार्यान्वयनको नक्शांकन देहाय बमोजिम रहेको छ ।

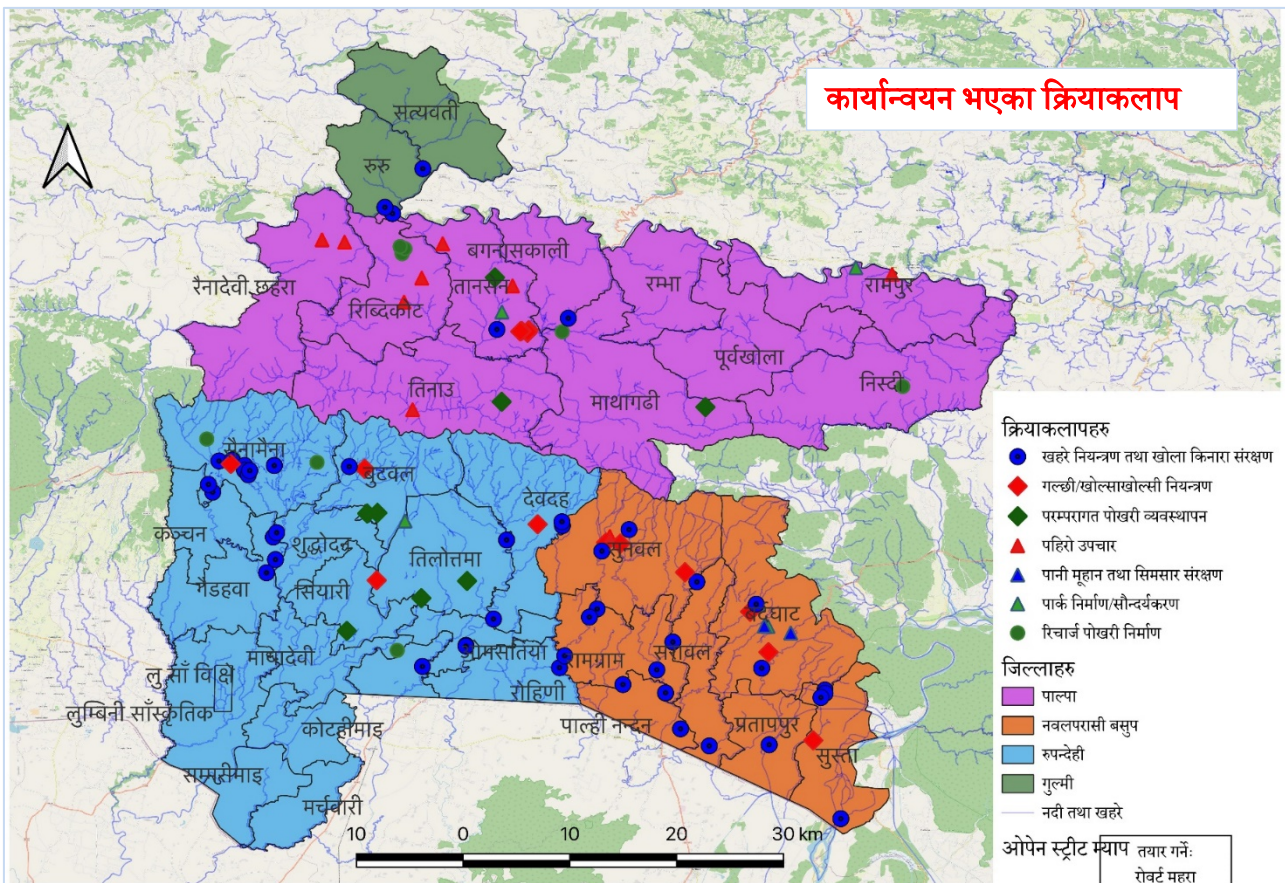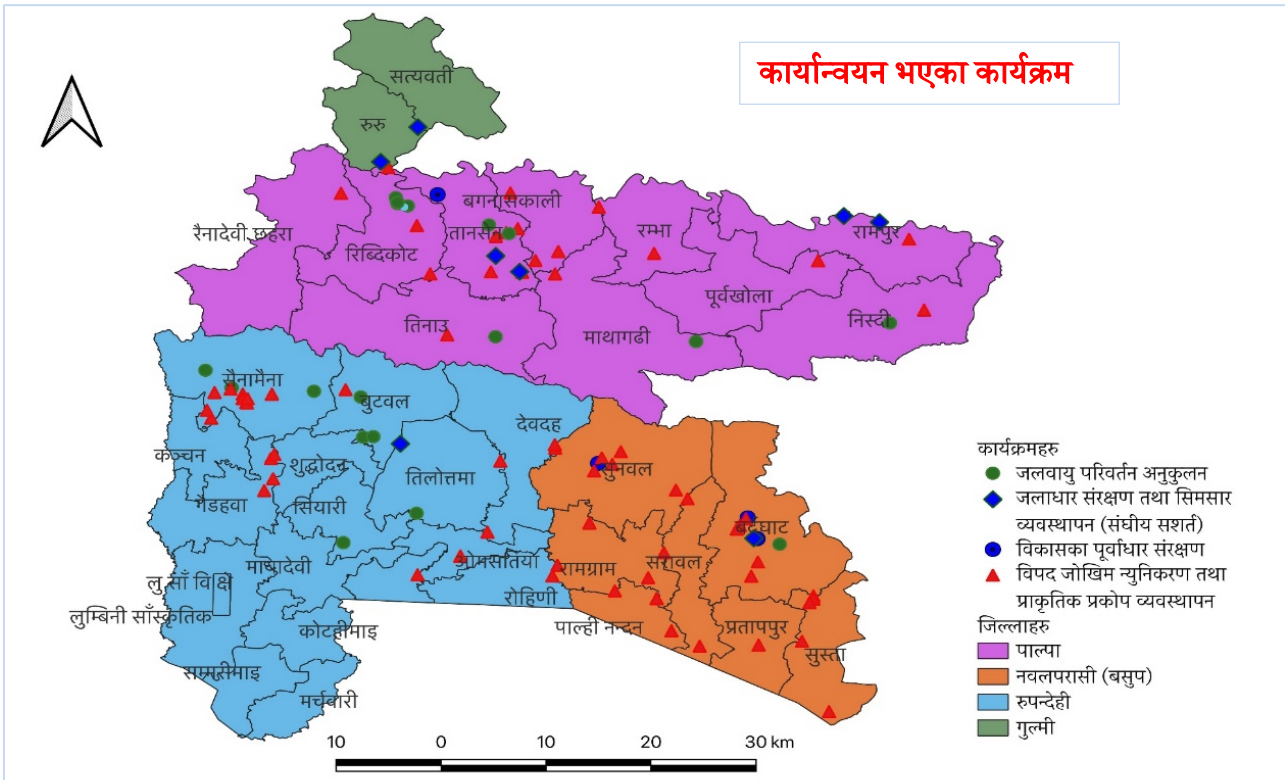

४.३ सम्पादित क्रियाकलाप/योजना अनुसार निर्माण गरिएका भौतिक एवं वानस्पतिक संरचनाको विवरण एवं हासिल गरिएका उपलब्धीको विवरण

सम्पादित जम्मा ९१ वटा क्रियाकलाप तथा योजनानुसार कार्यालयद्वारा यस आ.व. २०८२/०८३ मा तपसिल बमोजिम संरचनाहरु १०१ स्थानमा निर्माण भएका छन ।

क्र. सं.	क्रियाकलापको नाम	निर्माण गरिएको संरचना	स्थान	संरचनाको परीमाण	वृक्षारोपण	लाभान्वित घरधुरी	रोजगारी सिर्जना श्रमदिन
१	पहिरो उपचार	टेवा पर्खाल	१२	लम्बाई ५०४.२ मि. १८११ घ.मि.	भुजेत्रो: १५००	४५०	१७६८
२	गल्छी उपचार	छेकबाँध निर्माण	९	लम्बाई: १५८ मि., १३ वटा, ९०३ घ.मि.		२९१	६५१
३	खहरे नियन्त्रण तथा खोला किनारा संरक्षण	तटबन्धन	५६	लम्बाई: १७३३ मि., ७२६५ घ.मि.	बाँस कटीड: ३७६० आँप: ५१५ लिची: ५०० सितलचिनी: २००	१४९३	६०४२
४	रिचार्ज पोखरी निर्माण	रिचार्ज पोखरी	१०	क्षेत्रफल: १०,२४८ व.मि. पानी सञ्चित: १४,१८२ घ.मि.		१४०५	६३०
५	पार्क व्यवस्थापन	फेन्सीड, टेवा पर्खाल फल्याग स्टोन	५	लम्बाई: ९६५.८ मि.		५०००+	११५५
६	पानी मूहान तथा सिमसार क्षेत्र संरक्षण	टेवा पर्खाल	३	८१ मि.		७८	३२०
७	परम्परागत पोखरी व्यवस्थापन	रिचार्ज पोखरी पर्खाल निर्माण	७	क्षेत्रफल: ४,०४९ व. मि. पानी सञ्चित: ४,११० घ.मि.		४६५	९६७
जम्मा			१०१			९१८२+	११५३३

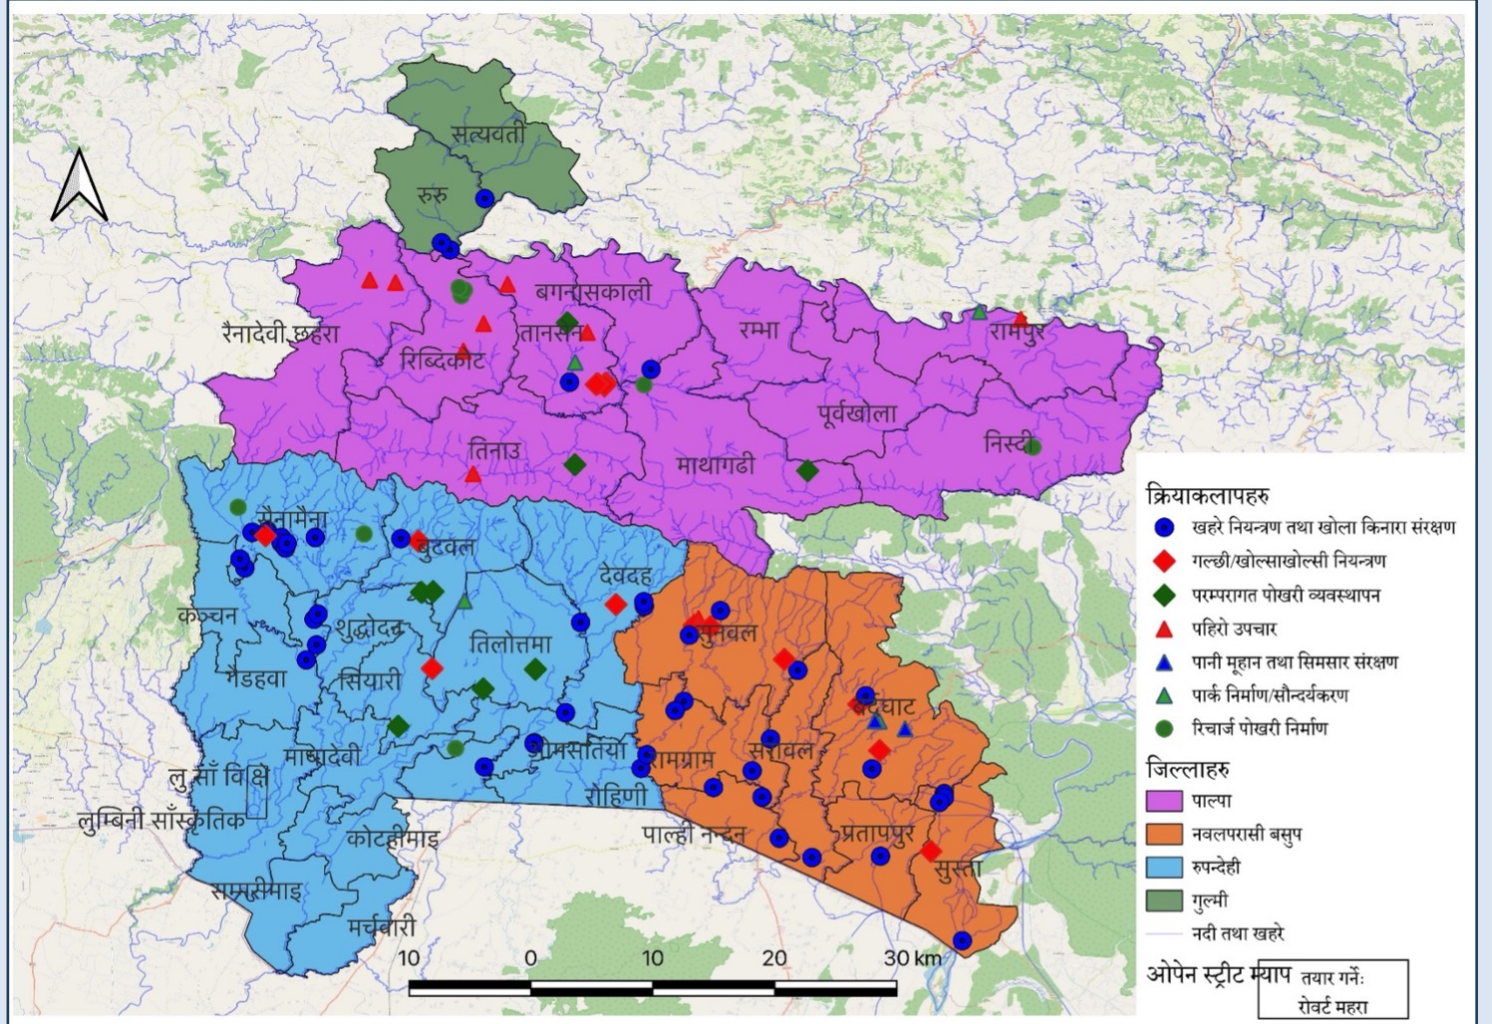

भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, पाल्पा

फोन नं.: ०७५-५२०१३९

मोबाइल नं.: ९८५७०६२८६४

Web: swmopalpa.lumbini.gov.np

Email: scwmopalpa@gmail.com
